Annex III: Diagrama de Gantt execució planta fotovoltaica

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	INICI DE PROJECTE	0 días	jue 01/11/07	jue 01/11/07
2	PREDISSENY	0,5 mss	jue 01/11/07	mié 14/11/07
3	**TRÀMITS COMPANYIA DISTRIBUÏDORA**	**140 días**	**jue 15/11/07**	**mié 28/05/08**
4	Punt de connexió	1,5 mss	jue 15/11/07	mié 26/12/07
5	Conveni d'interconnexió	1 ms	jue 03/04/08	mié 30/04/08
6	Contractes de compra-venda	1 ms	jue 01/05/08	mié 28/05/08
7	**TRÀMITS MUNICIPALS**	**110 días**	**jue 15/11/07**	**mié 16/04/08**
8	Autorització prèvia del projecte	2 mss	jue 15/11/07	mié 09/01/08
9	Permís d'obres i activitats	1 ms	jue 20/03/08	mié 16/04/08
10	**TRÀMITS AUTONÒMICS URBANÍSTICS**	**40 días**	**jue 10/01/08**	**mié 05/03/08**
11	Tràmits Autonòmics Mediambient/Urbanisme	2 mss	jue 10/01/08	mié 05/03/08
12	**TRÀMITS AUTONÒMICS DEPARTAMENT D'INDÚSTRIA**	**40 días**	**jue 06/03/08**	**mié 30/04/08**
13	Autorització Administrativa Evacuació	1 ms	jue 06/03/08	mié 02/04/08
14	REPE (Autortizació administrativa Generador)	1 ms	jue 03/04/08	mié 30/04/08
15	**EXECUCIÓ SUBSISTEMA D'EVACUACIÓ**	**100 días**	**jue 03/04/08**	**mié 20/08/08**
16	Projecte executiu i d'activitats	1 ms	jue 03/04/08	mié 30/04/08
17	Licitació subsistema d'evacuació	1 ms	jue 01/05/08	mié 28/05/08
18	**Execució subsistema d'evacuació**	**60 días**	**jue 29/05/08**	**mié 20/08/08**
19	Fase distribuidora	2 mss	jue 29/05/08	mié 23/07/08
20	Fase Client	3 mss	jue 29/05/08	mié 20/08/08
21	**EXECUCIÓ SUBSISTEMA GENERADOR**	**200 días**	**jue 27/12/07**	**mié 01/10/08**
22	Licitació	1 ms	jue 27/12/07	mié 23/01/08
23	Projecte executiu i d'activitat	2 mss	jue 24/01/08	mié 19/03/08
24	Ejecución subsistema generador	6 mss	jue 17/04/08	mié 01/10/08
25	**POSADA EN MARXA DE LA INSTAL·LACIÓ**	**70 días**	**jue 21/08/08**	**mié 26/11/08**
26	Posta en marxa subsistema d'evacuació	1 sem	jue 21/08/08	mié 27/08/08
27	Posta en marxa subsistema generador	1 ms	jue 02/10/08	mié 29/10/08
28	Legalització planta fotovoltaica (RIPRE, MT, Ajuntament, Distribuïdo	1 ms	jue 30/10/08	mié 26/11/08

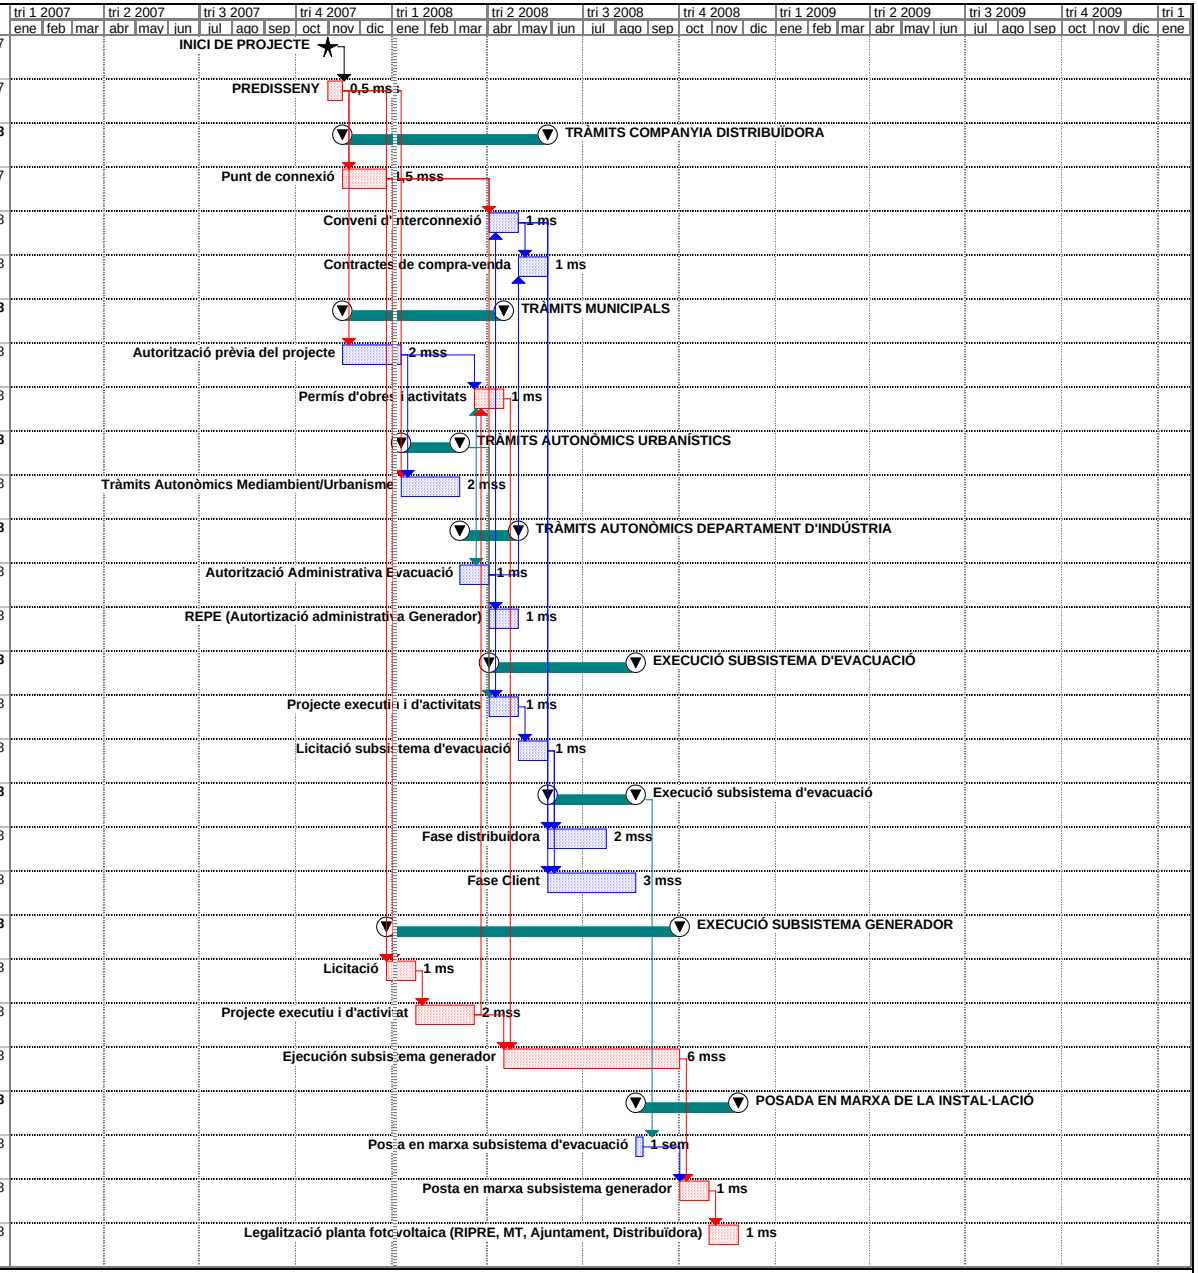

Tarea · Hito · Tarea crítica resumida · División · Agrupar por síntesis
Tarea crítica · Resumen · Hito resumido · Tareas externas · Fecha límite
Progreso · Tarea resumida · Progreso resumido · Resumen del proyecto
