



manel gonzález solanes & aleix gonzalez call
arquitectes

Rius i Taulet, 4 àtic
08172 St. Cugat del Vallès
Telèfon-fax 935.890.125
www.aresta.net



Ajuntament de Lleida

PRO-O63

PROJECTE EXECUTIU
PEL CANVI DEL
PARQUET DEL
PAVEL·LÓ BARRIS
NORD, LLEIDA

SETEMBRE 2023

MEMÒRIA

1. Memòria Descriptiva

1.1 Agents

Objecte del projecte
Promotor
Redactor
Altres tècnics

1.2 Informació prèvia

Dades generals
Dades urbanístiques
Descripció de patologies existents
Compliment del Codi Tècnic

1.3 Descripció del projecte

2. Compliment del CTE

DB-SE 3.1 Exigències bàsiques de seguretat estructural

SE-AE Accions en l'edificació
SE-C Fonamentació
SE-A Estructures d'acer
NCSE Norma de construcció sisme resistent
EHE Instrucció de formigó estructural

DB-SI 3.2 Exigències bàsiques de seguretat en cas d'incendi

SI 1 Propagació interior
SI 2 Propagació exterior
SI 3 Evacuació
SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis
SI 5 Intervenció de bombers
SI 6 Resistència al foc de l'estructura

DB-SU 3.3 Exigències bàsiques de seguretat d'ús

SU 1 Seguretat enfront al risc de caigudes
SU 2 Seguretat enfront al risc d'impacte o d'atrapament
SU 3 Seguretat enfront al risc d' "aprisionamiento"
SU 4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada
SU 5 Seguretat enfront al risc causat per situacions amb alta ocupació
SU 6 Seguretat enfront al risc d'ofegar-se
SU 7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SU 8 Seguretat enfront al risc relacionat amb l'acció del llamp

DB-HS 3.4 Exigències bàsiques de salubritat

HS 1 Protecció enfront a la humitat
HS 2 Eliminació de residus
HS 3 Qualitat de l'aire interior
HS 4 Subministrament d'aigua
HS 5 Evacuació d'aigües residuals

DB-HR 3.5 Exigències bàsiques de protecció enfront el soroll (CA-88)

DB-HE 3.6 Exigències bàsiques d'estalvi d'energia

HE 1 Limitació de demanda energètica
HE 2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques (RITE)
HE 3 Eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació
HE 4 Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària

3. Memòria constructiva**4. Plec de condicions****5. Estudi de SOS**

- Memòria tècnica:
 - 1.1. Descripció de les feines a executar
 - 1.2. Pressupost d'execució i material
 - 1.3. Pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut
 - 1.4. Termini d'execució
 - 1.5. Personal previst
 - 1.6. Serveis afectats
 - 1.7. Telèfons d'interès
- Estudi de seguretat i salut
- Plecs de condicions
- Annexes gràfics

6. Pressupost per a coneixement de l'administració**PLÀNOLS**

1. memòria descriptiva

1.1 Agents

Promotor:	AJUNTAMENT DE LLEIDA (P2515100B)	
Arquitecte:	Manel González Solanes i Aleix Gonzalez Call Rius i Taulet 4, àtic 08172 Sant Cugat del Vallès 93 589 01 25	
Director d'obra:	No adjudicat	
Director de l'execució de l'obra:	No adjudicat	
Altres tècnics	Instal·lacions: Estructures Telecomunicacions:	- - -
Seguretat i Salut	Autor de l'estudi: Coordinador durant l'elaboració del proj.: Coordinador durant l'execució de l'obra:	Manel González Solanes - -
Altres agents:	Constructor: Entitat de Control de Qualitat: Redactor de l'estudi topogràfic:	PER LICITAR NO ADJUDICAT -

1.2 Informació prèvia

Antecedents i condicionants de partida:	El paviment de fusta existent de tarima de fusta tipus massissa i sistema de suports de goma, s'ha fet malbé. En conseqüència, cal renovar tot l'àmbit de la pista de basquet, mitjançant un nou sistema que compleixi les normatives vigents i permeti abordar tot tipus de competicions.
Emplaçament:	Avda. Prat de la Riba, s/n, 25005 de Lleida
Entorn físic:	La intervenció s'efectua només en el terreny de joc
Normativa urbanística:	Es d'aplicació el PGM de la ciutat.

Ordenació dels Recursos Naturals i del Territori	
Instruments d'ordenació general de recursos naturals i del territori	No es d'aplicació
Instruments d'ordenació dels Espais Naturals Protegits	No es d'aplicació
Instruments d'Ordenació Territorial	No es d'aplicació
Ordenació urbanística	Pla General de Ordenació Urbana
	-
Categorització, Classificació i Règim del Sòl	
Classificació del Sòl	Urbà
Categoria	Equipaments esportius
Normativa Bàsica i Sectorial d'aplicació	No es d'aplicació

Adequació a la Normativa Urbanística:

ordenança	planejament	projecte	
	Referència a	Paràmetre / Valor	Paràmetre / Valor

M	PGM de Lleida		
Àmbit d'aplicació	Sistema d'espais lliures (EL)		-
Obres i activitats admissibles	Espais lliures o zones verdes amb zones d'esbarjo i zones esportives	Tipus 2	

Aspectes urbanístics singulars del projecte:

Intervenció en un equipament esportiu existent

Descripció de les patologies existents

Actualment, la instal·lació presenta una pista principal reglamentària de basquet, amb perímetres de competició FIBA, ampolles i cercle central massissat.

A causa del nivell d'ús molt intens del pavelló, la fusta presenta un estat d'envelliment i degradació que el porta a la fase final de la seva vida útil.

Les repercussions i les irregularitats es poden considerar com a greus, ja que poden derivar en distints tipus de lesions en els esportistes.

A banda, tan bon punt executades les proves biomecàniques específiques pel que fa referència a la normativa harmonitzada d'obligat compliment sobre el "bot de la pilota" -norma UNE EN14904:2007-, a hores d'ara els resultats no han estat satisfactoris, és a dir, no compleix els paràmetres i exigències mínimes. Aquesta norma regula no sols els requisits esportius, sinó també altres aspectes de seguretat bàsics com són la certificació al comportament enfront el foc (UNE EN13501), o la necessitat de presentar una declaració de prestacions dels requisits essencials per a poder presentar el marcatge CE corresponent. Com que la norma va estar publicada a l'any 2007, després d'instal·lació del paviment actual, el paviment actual resta exempt del compliment del marc normatiu vigent sobre el marcatge CE.

Els riscos fonamentals que es poden estar assumint per aquest fet, són els recollits en la Declaració de Prestacions del paviment regulat per la norma en vigor i es refereixen en concret a:

- Respecte al comportament al foc: Desconeguda la Euro-classe del paviment. En cas d'incendi es desconeix si el mateix pot col·laborar a augmentar la propagació de fum o flames.
- Respecte a l'absorció d'impactes (mínim 40%): Valor d'origen desconegut. Un paviment que no esmorteïx els impactes que es produeixen durant el joc de manera uniforme no es considera que tingui un comportament idoni per a la pràctica esportiva segura. Aquest valor no es refereix només a la protecció en casos de caigudes, sinó fonamentalment als impactes que ha de suportar de manera repetida la cadena múscul esquelètica de l'usuari en córrer i saltar sobre el mateix.
- Respecte al lliscament: Al no estar valorat aquest valor, es desconeix si el paviment rellisca massa (risc d'excés de caigudes), o si per contra agarra massa (risc de lesions articulars per torsions i traccions excessives).
- Respecte a la deformació vertical: Desconeixem que pugui estar conforme a la norma. Aquest valor sol tenir una relació inversa amb el d'absorció d'impactes.

- Respecte emissió i contingut de substàncies tòxiques (formaldehid i pentà clorofenol): es desconeix quins són aquests valors.
- A part d'aquests requisits essencials, la Norma UNE EN14904:2007 també estableix altres paràmetres que garantiran el comportament adequat recomanat per a aquesta mena de paviment. Aquests paràmetres són:
 1. *Durabilitat*: Resistència a càrregues per petjades romanents, càrregues rodades al desgast i als impactes. Acreditar que se superen els valors recomanats per la norma minimitza el risc de fer una adquisició d'un producte amb una vida útil limitada i no d'acord amb el nivell d'inversió realitzat.
 2. *Comportament vertical de la pilota*: Bot de pilota de manera suficient i uniforme.
 3. *Reflectància i lluentor especular de la superfície*: Necessari que sigui idoni per a un normal desenvolupament del joc, independentment del tipus d'il·luminació que existeixi.
 4. *Uniformitat*: El paviment s'ha de comportar de manera uniforme en tota la superfície i ha de presentar una planimetria correcta.

Les federacions esportives internacionals i nacionals reglamenten al seu torn el tipus de superfície de joc que requereixen per a les competicions de més alt nivell, formalitzant programes de certificació i esponsorització amb les empreses fabricadores.

Per a la resta de categories i competicions, la norma de referència, citada al seu torn en la majoria de reglaments esportius com a requisit mínim, és la UNE EN14904.

La majoria de les federacions que tenen establerts aquests programes i protocols d'homologació o reconeixement, exigeixen als productes per a la seva consideració, la certificació externa conforme la UNE EN 14904; com per exemple: FIBA (bàsquet), IHF (handbol), FIVB (voleibol), FIFA / UEFA (futbol sala), etc.

Com que no es pot aplicar cap mesura correctora de manteniment que pugui esmenar l'estat actual del paviment, es preveu renovar tota la superfície malmesa amb un nou sistema de fusta que compleixi tots els requeriments tècnics fixats en la norma UNE EN14904 i amb el certificat FIBA level 1&2, amb l'objectiu de deixar la instal·lació conforme el marc normatiu de seguretat vigent eliminant qualsevol risc físic de lesió.

1.3. Descripció del projecte

Descripció general de l'edifici:	Paviment flotant de fusta de faig La superfície de la pista de joc a substituir és de 1.366,30 m²
Programa de necessitats:	El programa de necessitats no s'altera
Us característic de l'edifici:	Equipament esportiu
Altres usos previstos:	No hi ha
Relació amb l'entorn:	No s'hi fa cap intervenció
Compliment del CTE:	Descripció de les prestacions de l'edifici per requisits bàsics i en relació amb les exigències bàsiques del CTE: No és d'aplicació Són requisits bàsics, conforme a la Llei d'ordenació de l'edificació, els relatius a la funcionalitat, seguretat i Habitabilitat.

S'estableixen aquests requisits amb el fi de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi ambient, havent els edificis de projectar, construir, mantenir-se i conservar-se de tal forma que es satisfacin aquests requisits bàsic

Quadre de superfícies

	Codi	SUPERFÍCIE
PISTA DE BÀSQUET		
SUPERFÍCIE INTERIOR		1.366,30 m ²
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA		1.366,30 m²

Descripció general de les tasques a desenvolupar

La proposta d'actuació consisteix en dur a terme la renovació de la superfície de la pista del pavelló. La proposta és instal·lar un sistema esportiu de parquet (fusta) de darrera generació, que aporti la funció tècnica i esportiva adequada als usos que demanda la instal·lació esportiva.

En la instal·lació s'inclou el marcatge de la pista de joc, el perímetre i ampolles i cercle central massissat, i l'adequació necessària per a l'ús de l'equipament esportiu (tapes / cercles d'ancoratges i remats perimetrals).

Seqüència dels treballs a executar:

1. Desmuntatge de la superfície de parquet de fusta existent establerta als amidaments, inclòs contenidor i gestió de residus.
2. Col·locació del nou sistema de paviment esportiu de parquet, incloent marcatges, tapes/cercles d'ancoratges i remat perimetral. Tot això d'acord amb les característiques i propietats mínimes dels materials que es defineixen a continuació, completament acabat i en servei.

Malgrat que no és d'aplicació a l'ésser una intervenció on no hi ha cap tipus d'edificació, adjunta normativa de referència on algunes partides d'obra s'hi poden veure reflectides

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de las normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents.

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció.

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.

A l'entrada en vigor del Codi Tècnic de l'Edificació, CTE, es deroguen diverses normatives i per donar compliment a les noves exigències bàsiques s'han d'aplicar els documents bàsics, DB, que componen la part II del CTE.

Degut a l'ampli abast del CTE, aquest es referència tant en l'àmbit general com en cada tema indicant el document bàsic o la secció del mateix que li sigui d'aplicació

A més, els productes de construcció (productes, equips i materials) que s'incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció de l'ús previst, duran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, transposada pel RD 1630/1992, de desembre, modificat pel RD 1329/1995.

En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s'han de complir en el projecte

Ambit general

Ley de Ordenación de la Edificación.

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99), modificació: Llei 52/2002, (BOE 31/12/02) Modificada pels Pressupostos generals de l'estat per a l'any 2003. art. 105

Codi Tècnic de l'Edificació

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación

D 462/71 (BOE: 24/3/71) modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación

O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d'errors (BOE: 6/7/71) modificada per l'O. 14/6/71 (BOE: 24/7/91)

Libro de Ordenes y visitas

D 461/1997, de 11 de març

Certificado final de dirección de obras

D. 462/71 (BOE: 24/3/71)

Requisits bàsics de qualitat

REQUISIT BÀSIC DE FUNCIONALITAT

Funcionalitat

Normativa en funció de l'ús: Habitatge

Llei de l'habitatge

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008)

Condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat

D 55/2009 (DOGC 9/4/2009) en vigor el 9/10/2009 (data visat de projecte)

Requisits mínims d'habitabilitat en els edificis d'habitatges i de la cèdula d'habitabilitat

D 259/2003 (DOGC: 30/10/03) correcció d'errades: DOGC: 6/02/04) derogat a partir del 9/10/2009 (data visat de projecte)

Libre de l'edifici

D 206/92 (DOGC: 7/10/92)

Es regula el llibre de l'edifici dels habitatges existents i es crea el programa per a la revisió de l'estat de conservació dels edificis d'habitatges

D 158/97 (DOGC: 16/7/97)

Acreditació de determinats requisits prèviament a l'inici de la construcció d'habitatges

D 282/91 (DOGC: 15/1/92)

Accessibilitat

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques

Llei 20/91 DOGC: 25/11/91

Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91

D 135/95 DOGC: 24/3/95

Condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l'accés y utilització dels espais pública urbanitzats i edificacions

Reial Decret 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007)

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

RD 314/2006 "Codi Tècnic de l'Edificació" BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007)

Telecomunicacions

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación

RD Ley 1/98 de 27 de febrer (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005)

Modificació de l'àmbit d'aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de la Edificación

Ley 38/1999 (BOE 6/11/99)

REQUISIT BASIC DE SEGURETAT

Seguretat estructural

CTE DB SE Seguretat Estructural

SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat

SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

Seguretat en cas d'incendis

CTE DB SI Seguretat en cas d'Incendi

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris a l'NBE-CPI-91

D 241/94 (DOGC: 30/1/95)

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005)

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI)

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Seguretat d'utilització

CTE DB SU Seguretat d'Utilització:

SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

SU-2 Seguretat enfront al risc d'impacte o enganxades

SU-3 Seguretat enfront al risc "d'aprisionament"

SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d'alta ocupació

SU-6 Seguretat enfront al risc d'ofegament

SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

REQUISIT BASIC D'HABITABILITAT

Sistemes estructurals

CTE DB SE Seguretat Estructural

SE 1 Resistència i estabilitat

SE 2 Aptitud al servei

SE AE Accions en l'edificació

SE C Fonaments

SE A Acer

SE M Fusta

SE F Fàbrica

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)

NRE-AEOR-93. norma reglamentària d'edificació sobre accions en l'edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d'edificis d'habitatges

O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural

RD 1247/2008, de 18 de juliol (BOE 22/08/2008) en vigor pels projectes encarregats a partir de l'1/12/2008

EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizado con elementos prefabricados

RD 642/2002 (BOE: 6/08/02) derogada pel RD 1247/2008, aplicable en els projectes encarregats abans de l'1/12/2008

EHE Instrucción de Hormigón Estructural

RD 2661/98 de 11 desembre (BOE: 13/01/99) derogada pel RD 1247/2008, aplicable en els projectes encarregats abans de l'1/12/2008

Sistemes constructius

CTE DB HS 1 Protección enfront de la humitat

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

Materials i elements de construcció

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos

O 18/12/92 (BOE: 26/12/92)

UC-85 recomendaciones sobre l'ús de cendres volants en el formigó

O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85)

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d'errades (BOE: 11/09/2008)

Control de qualitat

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposició de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005)

Control de qualitat en l'edificació

D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents

O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97)

Criteris d'utilització en l'obra pública de determinats productes utilitzats en l'edificació.

R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98)

Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas

RD 1630/80 (BOE: 8/8/80)

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados

R 30/1/97 (BOE: 6/3/97)

Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i d'elements resistents components de sistemes

D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95)

Residus d'obra i enderrocs

Residus

Llei 6/93, de 15 juliol, modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny.

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos

O. MAM/304/2002, de 8 febrero

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny

D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d'errades: (DOGC: 6/02/04)

Normatives acreditatives de paviments i instal·lacions esportives

Llei d'Ordenació d'Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l'Edificació (CTE RD. 314/2006)

Pla Director d'Instal·lacions i Equipaments esportius de Catalunya.

P.I.E.C. de maig de 2005, amb la seva Normativa tècnica d'equipaments esportius

Normativa NIDE (Normas sobre Instalaciones Deportivas y para el Esparcimiento)

Consejo Superior de Deportes

Llei 10/1990 de 15/10 (BOE 17-10-90) Normativa sobre instal·lacions esportives i oci (NIDE).

Fitxes i requeriments tècnics d'equipaments esportius del Consell Català de l'Esport

Les empreses licitadores també hauran de justificar que el procés que seguirà en la construcció del paviment esportiu s'ajusta a les normatives mediambientals.

Decret 95/2005 de 31/05/2005 (DGOC 02/06/2005) Creació de la comissió assessora del Pla Director d'instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya

Ordre PRE/79/2005, de 23 de febrer (DOGC núm. 4338 de 08/03/2005)

Instal·lacions i equipaments esportius. Aprovació dels programes d'actuacions especials.

Decret 100/1989, de la Presidència de la Generalitat. (DOGC 05/05/89). Text únic de la llei de l'esport.

Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol (DOGC núm 3199, de 2206/07/08) Llei de l'Esport.

Consejo Superior de Deportes. Gener 1980

Article 265.1 del Reglament General de la Reial Federació Espanyola de Futbol

Informe UNE 41958 en paviments esportius

UNE-EN 15.330-1:2013 Superfícies esportives. Superfícies de gespa artificial i punxonades principalment dissenyades per a ús exterior. Especificacions per a gespa artificial.

PROCÉS D'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'INSTAL·LACIÓ DEL PAVIMENT ESPORTIU DE FUSTA

Tal com s'indica en els apartats anteriors, el projecte té com a objecte la substitució i implantació d'un nou sistema de paviment esportiu de millors prestacions, seguint la normativa UNE i FIBA. La instal·lació s'executarà en tota la superfície, tot i seguint anàleg sistema i tipografia de marcatge que l'existent.

Treballs inicials

L'àmbit on es produirà la intervenció haurà d'estar sense cap tipus d'estri esportiu.

1. En primer lloc, es tallarà i desbastarà el paviment de fusta existent.
2. Tan bon punt feta la primera operació es procedirà a la retirada per mitjans mecànics i manuals.
3. El material extret es dipositarà en contenidors per, posteriorment, fer la gestió del residu a l'abocament.

Qüestions prèvies a l'execució

Solera

Abans de l'inici dels treballs de paviment esportiu de fusta, s'haurà de comprovar que es compleixen les següents condicions de planimetria en la superfície a intervenir:

- La superfície haurà de ser llisa i regular, sense sots ni embalums.
- Les toleràncies màximes planimètriques seran de 3 mm: mesures sota un regle de 3 m i 1mm mesures sota una regla de 20 cm.
- No hauran d'observar-se cap mena de fissures en la superfície.
- La superfície estarà neta, exempta de taques de pintura, guix, oli de des modelatge, així com de qualsevol altre producte contaminant.
- La humitat residual de la solera en el moment de la instal·lació, haurà d'estar per sota d'un 3%.
- A més de les condicions indicades anteriorment, el pavelló municipal haurà d'estar sec i tancat (finestres i portes).

En el cas de que la instal·lació disposi de calefacció, aquesta haurà de trobar-se en estat d'ús, per si fos necessari procedir a la posada en marxa, a fi de condicionar l'ambient als mínims de temperatura i humitat requerits.



Instal·lació de sistema de pavimentació

S'ha pensat en el subministrament i instal·lació d'un paviment tipus "àrea elàstic Mondoelastic" o equivalent, amb acabat en fusta de faig, de 62 mm de gruix total.

La composició es basa en una estructura inferior que es col·locarà sobre una làmina de polietilè de galga 500 estesa prèviament a sobre de la solera, per tal d'evitar la penetració de la humitat per capilaritat i, tanmateix, actuarà com a barrera de vapor.

Aquesta estructura es componrà a la seva part inferior d'uns suports de cautxú elàstics de disseny troncocònic, d'alçada 30 mm, diàmetre superior de 65 mm e inferior de 40 mm, fabricats mitjançant el sistema de modelat rotacional. Els suports elàstics hauran de ser instal·lats sobre taulells de contraxapat d'acord amb una distribució contrastada que garanteixi una perfecta uniformitat en la superfície final. Sobre els suports elàstics s'instal·laran 2 capes de contraxapats fenòlics de 9 mm. de gruix, creuades 70° cadascuna d'elles, encolades i cargolades entre si.

Sobre les mateixes i una vegada la planimetria resti uniforme i correcta, es procedirà a instal·lar una tarima de fusta noble de faig vaporitzat de gruix total 14 mm i 3,8 mm aproximats, amb un acabat envernissat procedent de la fàbrica subministradora. La instal·lació inclou tapes i cercles per als ancoratges i estris necessaris.

No s'acceptaran sistemes de paviments de fusta amb sub-bases elàstiques contínues (tipus "foam" o prefabricades), ni sistemes amb enrastellat o altres tipus de suports diferents als descrits anteriorment.

Senyalització de la pista de joc

S'efectua la senyalització de la pista de basquet amb pintura especial de color blanc, amb les mides reglamentàries federatives.

Remats perimetrals

Com a última actuació, es col·locaran els remats perimetrals a les juntes de trobada entre paviments, a base d'un perfil metàl·lic de xapa llisa d'acer inoxidable, de 1,5 mm de gruix i entre 70 i 120 mm d'ample, ancorat al paviment existent, totalment rematat.

Característiques dels materials a instal·lar

Les característiques principals que haurà de complir el sistema de paviment esportiu nou, són les següents:

- Sistema de paviment esportiu amb acabat de fusta de primera qualitat i sub-base elàstica prefabricada, que compleixi les característiques de la normativa EN14904.
- Sistema esportiu Certificat per la FIBA, ("FIBA APPROVED"), per a la categoria de paviments de fusta.
- Sistema esportiu Certificat per la FIFA QUALITY PROGRAMME FOR FUTSAL SUFACES - FiFA Quality.
- Compliment i acreditació de la classificació al foc, segons el codi tècnic de l'edificació.
- El sistema preveu una separació de dilatació perimetral, col·locant un remat perimetral en perfil metàl·lics de xapa galvanitzada de 1,5 mm de gruix i 70 a 120 mm d'ample.
- Làmina de polietilè anti humitat de galga 500, solapada 20 cm entre làmines, sota dels suports elàstics, per tal d'evitar que arribi humitat a tot el sistema del paviment.
- Suports de goma elàstics de disseny troncocònic d'alçada 30 mm, diàmetre superior de 65 mm e inferior de 40 mm, fabricats mitjançant el sistema de modelat rotacional, amb cambra d'aire interior.
- Doble contraxapat fenòlic de 9 mm de gruix, de 2500 mm de llarg i 1250 mm d'ample, creuats 70° entre ells, encolats i cargolats entre si.
- Superfície final en tarima de fusta de faig de 14 mm d'espessor, amb un mínim de 3,8 mm de fusta noble, 100% natural, envernissada de fàbrica específicament amb un tractament d'ús esportiu que garanteixi les propietats sol·licitades.
- Les làmines aniran encadellades i fixades mitjançant sistema de fixació amb claus ocults a 45°.
- No s'acceptaran variants al sistema.

ACTUACIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES

Per a poder desenvolupar les activitats esportives cal que el material esportiu de la instal·lació compleixi totes les normatives i mesures de les diferents federacions, específicament el compliment de les normes UNE i EN d'aplicació (EN 14904) i la Normativa FIBA. A fi i efecte d'aconseguir-ho es preveuen les següents actuacions:

Marcatges de pistes (prioritats i colors)

1. Bàsquet central (blanc) – 1 pista:
 - a) Cercle central i ampolles (vermell bordeus).
 - b) Perímetre FIBA (2m) (vermell bordeus).
2. Llegendes:
 - a) Escut Paeria al cercle central
 - b) "PAVELLO BARRIS NORD" i "LLEIDA" al perímetre exterior – banda llarga

Cèrcols i tapes

Es col·locaran tapes de faig mecanitzades, amb cercol d'alumini 140 mm, per a cobrir els ancoratges de la pista (En total 8 unitats).

1. CAPÍTOL PRELIMINAR. DISPOSICIONS GENERALS

Naturalesa i objecte del Plec General

Article 1.

El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte. Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord amb la legislació aplicable, al Promotor o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra, als seus tècnics i encarregats, Arquitecte, Arquitecte Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra.

Documentació del Contracte d'Obra

Article 2.

Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que es refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent:

1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte
2. L'empresa o arrendament d'obra si és que existeix.
3. El Plec de Condicions particulars.
4. El present Plec General de Condicions.
5. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost).

Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a escala.

CAPÍTOL I: CONDICIONS FACULTATIVES

Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques

Tècnic Director

Article 3. Correspon a tècnic Director:

- a. Comprovar l'adequació de la cimentació projectada a les característiques reals del sòl.
- b. Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.
- c. Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les contingències que es produïssin i impartir les instruccions complementàries que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta.
- d. Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció amb funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat.
- e. Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció.
- f. Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb el tècnic, el certificat de final d'obra.

Aparellador

Article 4. Correspon al tècnic :

- a. Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener.
- b. Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i econòmic de les obres.
- c. Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscriuint-la juntament amb tècnic i amb el Constructor.
- d. Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne la seva correcta execució.
- e. Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona construcció.
- f. Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de control, així com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d'acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la contingència no es resolgués s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte a tècnic.
- g. Fer els amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra.
- h. Subscriure, juntament amb tècnic, el certificat final d'obra.

El Constructor

Article 5. Correspon al Constructor:

- a. Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.
- b. Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra.
- c. Subscriure amb el tècnic, l'acte de replanteig de l'obra.
- d. Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes.
- e. Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzin, comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció del tècnic o Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació.
- f. Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin.
- g. Facilitar el tècnic, amb temps suficient, els materials necessaris per l'acompliment de la seva comesa.
- h. Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.
- i. Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva.
- j. Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.

Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista

Verificació dels documents del projecte

Article 6. Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents.

Pla de Seguretat i Salut

Article 7. El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé l'Estudi bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans del inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas de no ser necessària la designació de coordinador.

Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin del incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.

Oficina a l'obra

Article 8. El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin estendre i consultar els plànols.

En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa:

- El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti tècnic.
- La Llicència d'obres.
- El Llibre d'Ordres i Assistències.
- El Pla de Seguretat i Salut.
- La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5.j
- Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.
- El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa.

Representació del Contractista

Article 9. El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta.

Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5.

Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consignï en el Plec de "Condicions particulars d'índole facultativa" el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos.

El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa.

El incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà tècnic per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència.

Presència del Constructor en l'obra

Article 10. El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de treball i acompanyarà al tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels

reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació dels amidaments i liquidacions.

Treballs no estipulats expressament

Article 11. Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi tècnic dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució.

En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100.

Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte

Article 12. Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les còpies subscriuint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebí, tant de tècnic o Tècnic com de tècnic.

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol·licités.

Article 13. El Constructor podrà requerir del tècnic, segons les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte.

Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa

Article 14. Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la Direcció Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de tècnic, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre del tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a tècnic, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions.

Recusació pel Contractista del personal nomenat per tècnic

Article 15. El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i amidaments.

Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense que per això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs.

Faltes del personal

Article 16. Tècnic, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbació.

Article 17. El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, se subjecten en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra.

Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars

Replanteig

Article 19. El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta.

El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació del tècnic i una vegada aquest últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per tècnic, i serà responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit.

Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs

Article 20. El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigít en el Contracte.

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte al tècnic del començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació.

Ordre dels treballs

Article 21. En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar.

Facilitat per a altres Contractistes

Article 22. D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes.

En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa.

Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major

Article 23. Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes pel tècnic en tant es formula o tramita el Projecte Reformat.

El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres disposi per fer calçats, apuntalaments, enderroc, re calçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, el import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli.

Pròrroga per causa de força major

Article 24. Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de tècnic. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a tècnic la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada causa sol·licita.

Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra

Article 25. El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat.

Condicions generals d'execució dels treballs

Article 26. Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin al tècnic i al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l'article 11.

Durant l'execució de l'obra es findran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Obres ocultes

Article 27. De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s'estendran per triplicat i se n'entregaran: un al tècnic i l'altre al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar els amidaments.

Treballs defectuosos

Article 28. El Constructor haurà d'emprar materials que compleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en l'esmentat document.

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competència del tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran abonades a bon compte.

Com a conseqüència de l'expressat anteriorment, quan el tècnic detecti vici o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta.

Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant tècnic de l'obra, que ho resoldrà.

Vicis ocults

Article 29. Si el tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a tècnic. Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat.

Dels materials i dels aparells. La seva procedència

Article 30. El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptui una procedència determinada. Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar al tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun.

Presentació de mostres

Article 31. A petició del tècnic, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista en el Calendari de l'Obra.

Materials no utilitzables

Article 32. El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra.

Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra. Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni el tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa taxació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport.

Materials i aparells defectuosos

Article 33. Quan els materials, elements d'instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegué o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, tècnic, a instàncies del tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o compleixin l'objectiu al qual es destinen.

Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta.

Si els materials, elements d'instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de tècnic, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los per altres en condicions.

Neteja de les obres

Article 35. Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte.

Obres sense prescripcions

Article 36. En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atindrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció.

Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes

De la recepció definitiva

Article 42. La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció.

Pròrroga del termini de garantia

Article 43. Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i el tècnic-Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança.

De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida

Article 44. En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una altra empresa.

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35.

Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de tècnic Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció.

CAPÍTOL II: CONDICIONS ECONÒMIQUES

Epígraf 1: Principi general

Article 45. Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades per a la seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes.

Article 46. La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir recíprocament les garanties adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament.

Epígraf 2: Fiances

Article 47. El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli:

- a) Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de contracta (art.53).
- b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció.

Execució de treballs amb càrrec a la fiança

Article 49. Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les condicions contractades, el tècnic-Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que el import de la fiança no fos suficient per cobrir el import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció.

De la seva devolució en general

Article 50. La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes.

Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials

Article 51. Si la propietat, amb la conformitat del tècnic Director, accedís a fer recepcions parcials, tindrà dret el Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança.

Epígraf 3: Dels preus

Composició dels preus unitaris

Article 52. El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial.

Es consideren costos directes:

- a. La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de la unitat d'obra.
- b. Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin necessaris per a la seva execució.
- c. Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i infermetats professionals.
- d. Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la maquinària i instal·lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra.
- e. Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips anteriorment citats.

Es consideraran costos indirectes:

Les despeses d'instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifrarán en un percentatge dels costos directes.

Es consideraran despeses generals:

Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment establertes. Es xifrarán com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.)

Benefici industrial

El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors.

Preu d'Execució material

S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el Benefici Industrial.

Preu de Contracta

El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial. L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu.

Preus de contracta. Import de contracta

Article 53. En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent.

Preus contradictoris

Article 54. Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant el tècnic decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista.

El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis.

Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el tècnic i el Contractista abans de començar l'execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la localitat.

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.

Reclamacions d'augment de preus per causes diverses

Article 55. Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres (amb referència a Facultatives).

Formes tradicionals de mesurar o d'aplicar els preus

Article 56. En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus o de la forma de mesurar les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars.

De la revisió dels preus contractats

Article 57. Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que el increment no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) del import total del pressupost de Contracte.

En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord amb la fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebin el Contractista la diferència en més que resulti per la variació de l'IPC superior al 3 per 100.

No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta.

Emmagatzemat de materials

Article 58. El Contractista està obligat a fer els emmagatzemats de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni per escrit.

Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva cura i conservació en serà responsable el Contractista.

Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs

Formes diferents d'abonament de les obres

Article 67. Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de Condicions econòmiques s'hi preceptuï una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així:

1. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu cas al import de la baixa efectuada per l'adjudicatari.
2. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar solament el nombre d'unitats executades.
3. Prèvia amidament i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista el 'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a l'amidament i valoració de les diverses unitats.
Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la seva execució d'acord amb les ordres del tècnic-Director.
4. S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior.

5. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions econòmiques" determina.
6. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte.

Relacions valorades i certificacions

Article 68. En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plec de Condicions Particulars" que regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons l'amidament que haurà practicat tècnic.

El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de l'amidament general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc.

Al Contractista, que podrà presenciar els amidaments necessaris per estendre aquesta relació, tècnic li facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, el tècnic-Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de tècnic-Director en la forma prevista en els "Plec Generals de Condicions Facultatives i Legals".

Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, tècnic-Director expedirà la certificació de les obres executades.

Del import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert.

El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, es podrà certificar fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta.

Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter de document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen.

Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas que el tècnic-Director ho exigís, les certificacions s'estendran a l'origen.

Millores d'obres lliurement executades

Article 69. Quan el Contractista, inclòs amb autorització del tècnic-Director, utilitzés materials de preparació més acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de tècnic-Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada.

Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada

Article 70. Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a continuació s'expressen:

- a. Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran prèvia amidament i aplicació del preu establert.
- b. Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida alçada, deduïts dels similars contractats.
- c. Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que el import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, tècnic-Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, incrementant el import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista.

Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats

Article 71. Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o ordinària, que per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta.

A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per cent del import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars.

Pagaments

Article 72. El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.

El import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades pel tècnic-Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments.

Abonament de treballs executats durant el termini de garantia

Article 73. Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu abonament es procedirà així:

1. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat pel Contractista al seu temps, i el tècnic-Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims.
2. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats.
3. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat dels materials, no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista.

Epígraf 6: De les indemnitzacions mútues

Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres

Article 74. La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil del import total dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra. Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança.

Demora dels pagaments

Article 75. Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini convingut, el Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre el import de la certificació.

Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, es procedirà a la liquidació corresponent de les obres executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per a la finalització de l'obra contractada o adjudicada.

Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundat en la demora de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de la sol·licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte.

Epígraf 7: Varis

Millores i augments d'obra. Casos contraris

Article 76. No s'admetran millores d'obra, només en el cas que el tècnic-Director hagi manat per escrit l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte.

Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en els amidaments del Projecte, a no ser que tècnic-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades.

En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre el import de les unitats contractades.

Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan el tècnic-Director introdueixi innovacions que suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades.

Unitats d'obra defectuoses però acceptables

Article 77. Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons tècnic-Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb la resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir el termini.

Assegurança de les obres

Article 78. El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. El import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una

indemnització equivalent al import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte al import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats amb aquesta finalitat pel tècnic-Director.

En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra.

Els riscos assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions.

Conservació de l'obra

Article 79. Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, el tècnic-Director, en representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta.

En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que tècnic-Director fixi.

Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del Contractista, no s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar.

En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques".

Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari

Article 80. Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat.

En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança.

El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista.

CAPÍTOL 3 PLEC GENERAL DE CONDICIONS TECNQUES

El Plec de Condicions Generals compren el conjunt de característiques que hauran de complir els materials que s'utilitzin a la construcció, i també les tècniques per a la seva col·locació a l'obra i per a orientar l'execució de qualsevol tipus d'instal·lació i les obres que hi depenen.

Totes aquestes Condicions queden recollides al "Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura" de 1960 i correccions posteriors, que a tots efectes es donen per reproduïdes aquí, així com el Plec corresponent del Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya - ITEC-.

CAPÍTOL 4 PLEC GENERAL DE CONDICIONS LEGALS

En el propi document de contracte amb l'Adjudicatari es recolliran els altres aspectes legals particulars que complementaran aquest Plec i formaran el Document del Contracte d'Obres que regirà les relacions entre Promotor, Direcció Facultativa i Contractista per a l'obra que ens ocupa.

En tot cas, i com a condició a ressaltar, es posa de manifest que el projecte el componen el conjunt de tots els seus documents i que les errades materials, absències o contradiccions que puguin presentar-se entre les diverses parts s'han de resoldre seguint la lògica constructiva que inspira el projecte, de manera no poden ser utilitzats per a reduir la seva qualitat ni per a incrementar el seu pressupost. Per tant, durant la fase d'estudi per a efectuar l'oferta econòmica, l'adjudicatari potencial ha de posar tals possibles deficiències en coneixement de la propietat dins la pròpia oferta.

CAPÍTOL 5 GARANTIA

Tots els materials que formen el sistema del paviment tindran una garantia mínima d'un any des del moment del subministrament i instal·lació d'aquest.

2. PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

Sobre de l'execució de l'obra i els seus materials:

Propietats mínimes del sistema instal·lat

Les propietats que es requeriran al sistema esportiu de fusta instal·lat hauran d'estar compreses entre els següents paràmetres que detallem a continuació, basats en norma europea UNE-EN 14904.

- Absorció d'impactes: $\geq 55\%$
- Bot de pilota: $\geq 97\%$
- Deformació Vertical: $\geq 2,8\text{mm}$
- Resistència al lliscament: ≥ 80
- Brillo Especular: ≤ 40
- Classificació al foc: Cfl – s1

UNE-EN 14904:2007 "SUPERFÍCIES PER A ÀREES ESPORTIVES. ESPECIFICACIONS PER A SÒLS ESPORTIUS MULTIÚS D'INTERIOR" – SISTEMA ÀREA – ELÀSTIC"	
Reducció de força màxima (UNE-EN 14808)	(%) $\geq 40 < 75$
Deformació vertical estàndard (UNE-EN 14809)	(mm) $\geq 1,8 < 5,0$ mm
Fricció / Resistència al lliscament (UNE-EN 13036-4)	80 – 110
Bot vertical de pilota (UNE-EN 12235)	$\geq 90\%$
Resistència a impactes (UNE-EN 1517)	Petjada residual $\leq 0,5$ mm
Resistència a petjada romanent (UNE-EN 1516)	$\leq 0,5$ mm
Resistència a càrregues rodades (UNE-EN 1569)	Càrrega mínima 1500 N, petjada màxima 0,5 mm sota vora recta de 300 mm, sense danys
Resistència a abrasió (UNE-EN-ISO 5470-1)	Màxima perduda de pes 80 mg (1000 cicles, rodes CS-10, carga 0,5 kg)
Aplanetat/ Regularitat Superficial (UNE-EN 13036-7)	≤ 6 mm amb regla de 3 m; ≤ 2 mm amb regla de 0,3 m
Brillo especular (UNE-EN 2813)	$\leq 45\%$ Superfícies envernissades
Emissió de formaldehids (UNE-EN 717)	E1 ó E2
Contingut de pentà clorofenol (PCP)	$\leq 0,1$
Reacció al foc UNE-EN 13501-1	Classificació

El paviment esportiu té les condicions suficients per a suportar el pes de cistelles mòbils i elevadors per a fer el manteniment del material esportiu i de les lluminàries.

3. PROVES MÍNIMES PER A LA RECEPCIÓ PROVISIONAL

Durant l'execució de l'obra es realitzaran les proves i assaigs que la Direcció Facultativa cregui oportunes (al marge del Control de qualitat corresponent) amb laboratoris oficials, del resultat dels quals en tindrà coneixement la Contracta i la Direcció Facultativa. Aquests assaigs es consideraran compresos als preus de les corresponents unitats d'obra, fins un import total de 1% del Pressupost d'Adjudicació, passat el qual els assaigs positius seran a càrrec del Promotor i els negatius a càrrec del Contractista.

Abans de la Recepció Provisional de l'obra, s'efectuarà un darrer conjunt d'assaigs i proves que permetran o no la recepció provisional.

4. AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES

L'amidament de l'obra es farà pel tècnic i pel contractista o representant seu.

Els criteris d'amidament seran els que fixen les Condicions Tècniques de partides d'obra del Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC).

Per a la part de l'obra oculta s'utilitzaran com a base les dades del replanteig general i replanteigs parcials que serveixen per a la direcció concreta dels treballs. Els amidaments de l'obra visible es farà directament sobre els seus elements seguint les partides del pressupost.

Els treballs i obres efectuats pel Contractista s'abonaran mitjançant certificacions a bon compte, aplicant a les unitats d'obra realitzades els preus unitaris del projecte. Les certificacions seran subscriïdes per la Direcció Facultativa i aprovades per l'organisme corresponent.

Pel tipus d'obra volum i terminis d'execució no s'abonaran acopis de materials.

Descripció tasques a efectuar

La proposta d'actuació consisteix en dur a terme la renovació de la superfície de la pista del pavelló. La proposta és instal·lar un sistema esportiu de parquet (fusta) de darrera generació, que aportï la funció tècnica i esportiva adequada als usos que demanda la instal·lació esportiva.

En la instal·lació s'inclou el marcatge de la pista de joc, el perímetre i ampolles i cercle central massissat, i l'adequació necessària per a l'ús de l'equipament esportiu (tapes / cercles d'ancoratges i remats perimetrals).

Seqüència dels treballs a executar:

1. Desmuntatge de la superfície de parquet de fusta existent establerta als amidaments, inclòs contenidor i gestió de residu.
2. Col·locació del nou sistema de paviment esportiu de parquet, incloent marcatges, tapes/cercles d'ancoratges i remat perimetral. Tot això d'acord amb les característiques i propietats mínimes dels materials que es defineixen a continuació, completament acabat i en servei.

Pressupost de contracte

El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 222.712,99 € IVA inclòs.

Pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut

El pressupost d'execució material de les obres de Seguretat i Salut, és de tres cents seixanta set euros. (367,00 €).

Termini d'execució

El termini estimatiu total de l'execució de l'obra contractada és de set setmanes.

Personal previst

La mitja prevista es de 2 persones, considerant una punta de 4 treballadors.

Totes les persones rebran informació dels treballs a realitzar i els riscos que comporta, així com la formació per la correcta adaptació de mesures de seguretat, per minimitzar-les mitjançant la implantació d'equips de protecció col·lectiva, en primer lloc, i d'utilització d'equips de protecció individual, en segon lloc.

Serveis afectats

Tal com s'ha indicat, no es preveu cap tipus d'afectació en els serveis públics. No obstant, abans de començar es comunicarà a totes les companyies l'inici de les obres per evitar qualsevol eventualitat o incidència, aixecant un acta on es posarà de manifest l'estat actual de tots ells.

- Accessos i vials d'obra: S'efectuaran per tots aquells indrets que no entorpeixin el seu funcionament.
- Línies elèctriques aèries, soterrades i transformadors: no hi ha cap tipus d'interferència.
- Telecomunicacions: Tampoc es veuen afectades.
- Clavegueram, conduccions d'aigua i gas: no es troben afectades.

Telèfons d'interès general

- CAP Balàfia Pardinyes Secà de Sant Pere Centre de Salut
Avinguda de Rosa Parks, 0, 25005 Lleida
973 23 06 35
- Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Av. Alcalde Rovira Roure, 80, 25198 Lleida
973 24 81 00
- MOSSOS D'ESQUADRA: 112
- POLICIA URBANA LOCAL: 092

- PROTECCIÓ CIVIL: 112
- AMBULANCIES: 112
- POLICIA NACIONAL: 091
- BOMBERS: 080

Principals accions a tenir en compte en qüestions de seguretat i salut

En el desenvolupament de l'obra hi haurà una sèrie d'accions com les descrites en aquest apartat en les que caldrà prendre especial atenció en quant riscos més propis i específics d'aquesta, tant per al personal de l'obra com per a les persones que passin per la via pública prop d'aquesta, amb el ben entès que la següent descripció no ha de restar la més mínima atenció a tots els altres treballs a realitzar i que es descriuen en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, així com al preceptiu Pla de seguretat i Salut que haurà d'aprovar el Coordinador de Seguretat i Salut.

Les accions generals a tenir en consideració i a garantir la seguretat en aquesta obra són:

- Delimitar mitjançant tanques homologades que impedeixin el pas amb la senyalització que incorpori l'avertiment de treballs amb maquinària pesada per tot l'entorn de l'obra afectat durant les operacions de moviment de terres, tant de càrrega com de l'aplec de materials, sobretot en les que hi treballen màquines que comporten un risc elevat d'atropellament o caiguda d'objectes.
- Després de cada fase de treball en que es pugui afectar la via pública, com pot ser per l'acumulació de residus sobre aquesta, caldrà fer immediatament la neteja i retirada d'aquests de manera que en tot l'espai fora de l'obra les condicions siguin les mateixes que abans dels treballs.
- En l'excavació de les rases i pous corresponents a la fonamentació, caldrà prendre especial cura a l'hora d'executar les que estan en contacte amb la tanca o mitgeres que delimiten el solar per tal de no causar-los danys si s'excavés a cota inferior a la seva fonamentació, cas en que la direcció facultativa decidirà si es tenen que prendre mesures complementàries.
- Quan es col·loquin les armadures corresponents a la fonamentació o més endavant a la resta de l'estructura, caldrà prendre especial atenció en protegir amb caputxons tots aquells extrems de les barres que puguin causar danys als operaris en el cas de topada o de caiguda.
- A l'execució del forjat com caldrà que sempre es tingui el perímetre o forats, assegurats amb baranes i proteccions que correspongui, i en un dels seus costats caldrà disposar-hi una bastida amb una escala per tal de poder accedir a aquest nivell amb total seguretat. En el cas que això no sigui possible, els operaris que es moguin per la zona de risc, aniran subjectats amb el corresponent arnés de seguretat correctament instal·lat.
- Les bastides que s'utilitzaran estaran homologades i se n'assegurarà l'estabilitat i correcta utilització, seguint les corresponents mesures de seguretat fixades pel fabricant.

Tots els treballs es realitzaran en front a la vorera del carrer de Catalunya, caldrà sol·licitar ocupació de la vorera i delimitar els espais interns de l'obra que garanteixin la circulació i la seguretat dels vianants per la vorera, així com, el bon funcionament de l'obra, d'acord amb el coordinador de seguretat i salut.

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ"

INTRODUCCIÓ

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció".

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència.

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració de contractistes.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis generals:

- Evitar riscos
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar
- Combatre els riscos a l'origen
- Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut
- Tenir en compte l'evolució de la tècnica
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
- Donar les degudes instruccions als treballadors

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per:

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.
- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
- La recollida dels materials perillosos utilitzats
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball
- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pugués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures.

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de cobertura, la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades.

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han de:

- Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que desenvolupin la seva activitat.
- Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista
- No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball
- Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels treballadors.
- Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines.

Mitjans i maquinaria

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
- Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)
- Riscos derivats del funcionament de grues
- Caiguda de la càrrega transportada
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques
- Altres

Treballs previs

- Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de materials
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
- Altres

Enderrocs

- Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Fallida de l'estructura
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Acumulació i baixada de runes
- Altres

Moviments de terres i excavacions

- Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar
- Altres

Fonaments

- Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Fallides d'encofrats
- Fallides de recalços
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
- Altres

Estructura

- Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Fallides d'encofrats
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
- Riscos derivats de l'accés a les plantes
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials
- Altres

Ram de paleta

- Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
- Altres

Revestiments i acabats

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
- Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades
- Altres

Instal·lacions

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre-esforços per postures incorrectes
- Caigudes de pals i antenes
- Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades
- Altres

RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA.

(Annex II del RD 1627/1997))

- Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball
- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible
- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades
- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
- Treballs que impliquin l'ús d'explosius
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

Com a criteri general es duren a terme les proteccions col·lectives en front de les individuals. S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)

Mesures de protecció col·lectiva

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra
- Senyalització de les zones de perill
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents
- Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives
- Fonamentar correctament la maquinària d'obra
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
- Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
- Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, edificacions veïnes)
- Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les rases
- Utilització de paviments antilliscants.
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
- Ús d'escaleres de mà, plataformes de treball i bastides homologades
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes
- Instal·lació de serveis sanitaris

Mesures de protecció individual

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
- Utilització de calçat de seguretat
- Utilització de casc homologat
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixos de protecció o de protecció col·lectiva, caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat als operaris amb formació i capacitat suficient.
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
- Utilització de mandils
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

Mesures de protecció a tercers

- Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

PRIMERS AUXILIS

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

RELACIO DE NORMES I REGLAMENTS APLICABLES

SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles.

Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE: 26/08/92).

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

R.D. 1627/1997, de 24 octubre (BOE: 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE.

Ley de prevención de riesgos laborales.

Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 10/11/95).

Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.

Ley 54/2003. 12 diciembre (BOE: 13/12/2003).

Reglamento de los servicios de prevención.

R.D. 39/1997. 17 de enero (BOE: 31/01/97). Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril (BOE: 01/05/98).

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en altura.

R.D. 2177/2004, de 12 de novembre, (BOE: 13/11/2004).

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo.

R.D. 485/1997. 14 abril (BOE: 23/04/97).

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

R.D. 486/1997. 14 de abril (BOE: 23/04/97) En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la " Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo" (O. 09/03/1971).

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores.

R.D. 487/1997, de 14 d'abril (BOE: 23/04/97).

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.

R.D. 488/97. 14 abril (BOE: 23/04/97).

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

R.D. 664/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97).

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

R.D. 665/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97).

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

R.D. 773/1997.30 mayo (BOE: 12/06/97).

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

R.D. 1215/1997. 18 de julio (BOE: 07/08/97) transposició de la directiva 89/655/CEE. Modifica i deroga alguns capítols de la " ordenanza de seguridad e higiene en el trabajo" (O. 09/03/1971).

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.

R.D. 1316/1989 . 27 octubre (BOE: 02/11/89).

Protección contra riesgo eléctrico.

R.D. 614/2001. 8 junio (BOE: 21/06/01).

Instrucción Técnica Complementaria MIE-APQ-006. Almacenamiento de líquidos corrosivos.

R.D 988/1998 (BOE: 03/06/98).

Reglamento de seguridad e higiene del trabajo en la industria de la construcción.

O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52). Modificacions: O. 10 diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)

O. 23 septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) Art. 100 A 105 derogats per O. de 20 gener de 1956. Capítol III derogat pel RD 2177/2004.

Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica.

O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1 a 4, 183 a 291 y anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) correcció d'errades: BOE: 17/10/70.

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.

O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87).

Reglamento de aparatos elevadores para obras.

O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81).

Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a grúas-torre desmontables para obras.

R.D. 836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03). vigent a partir del 17 d'octubre de 2003. (deroga la O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) i la modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90).

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto.

O. de 31 octubre 1984 (BOE: 07/11/84).

Normas complementarias del reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto.

O. de 7 enero 1987 (BOE: 15/01/87).

Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.

O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 I 17/03/71) Correcció d'errades (BOE: 06/04/71) Modificació: (BOE: 02/11/89) derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997.

S'aprova el model de llibre d'incidències en obres de construcció.

O. de 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/98).

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Cascos no metálicos.

R. de 14 de desembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1.

Protectores auditivos.

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2.

Pantallas para soldadores.

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Modificació: BOE: 24/10/75.

Guantes aislantes de electricidad.

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 25/10/75.

Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos.

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5 modificació: BOE: 27/10/75.

Banquetas aislantes de maniobras.

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6 modificació: BOE: 28/10/75.

Equipos de protección personal de vías respiratorias. normas comunes y adaptadores faciales.

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75.

Equipos de protección personal de vías respiratorias: filtros mecánicos.

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75.

Equipos de protección personal de vías respiratorias: filtros mecánicos.

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8. Modificació: BOE: 30/10/75.

Equipos de protección personal de vías respiratorias: mascarillas autofiltrantes.

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9. Modificació: BOE: 31/10/75.


Equipos de protección personal de vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco.

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 . Modificació: BOE: 01/11/75.

Señalización Obligación




Señalización Advertencia

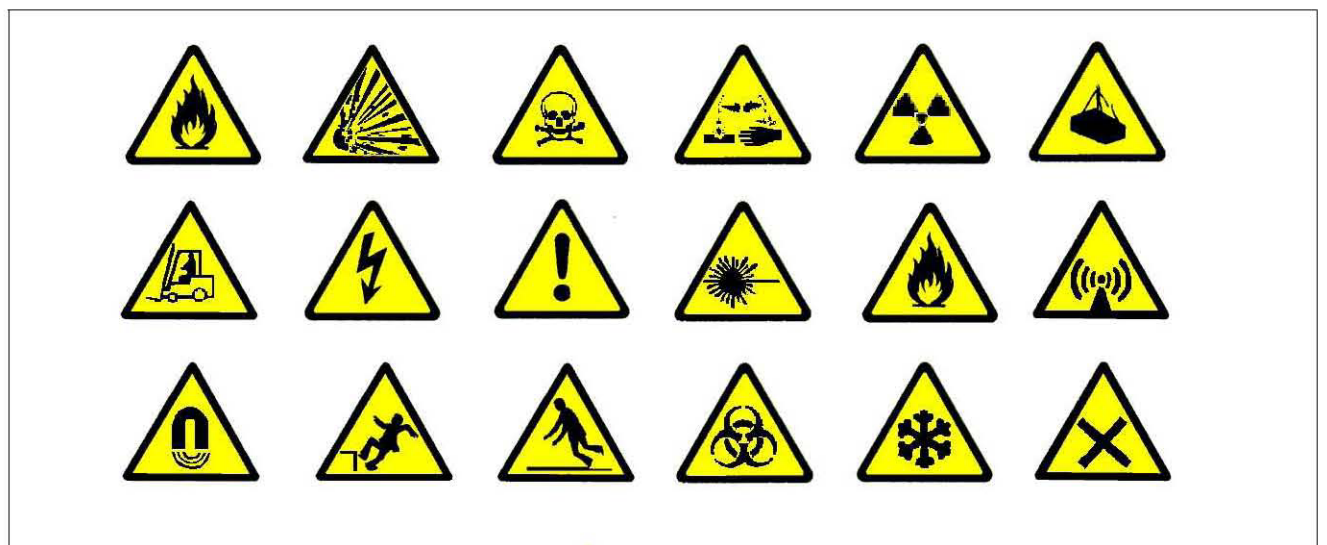


Instalaciones eléctricas

Instalación eléctrica provisional

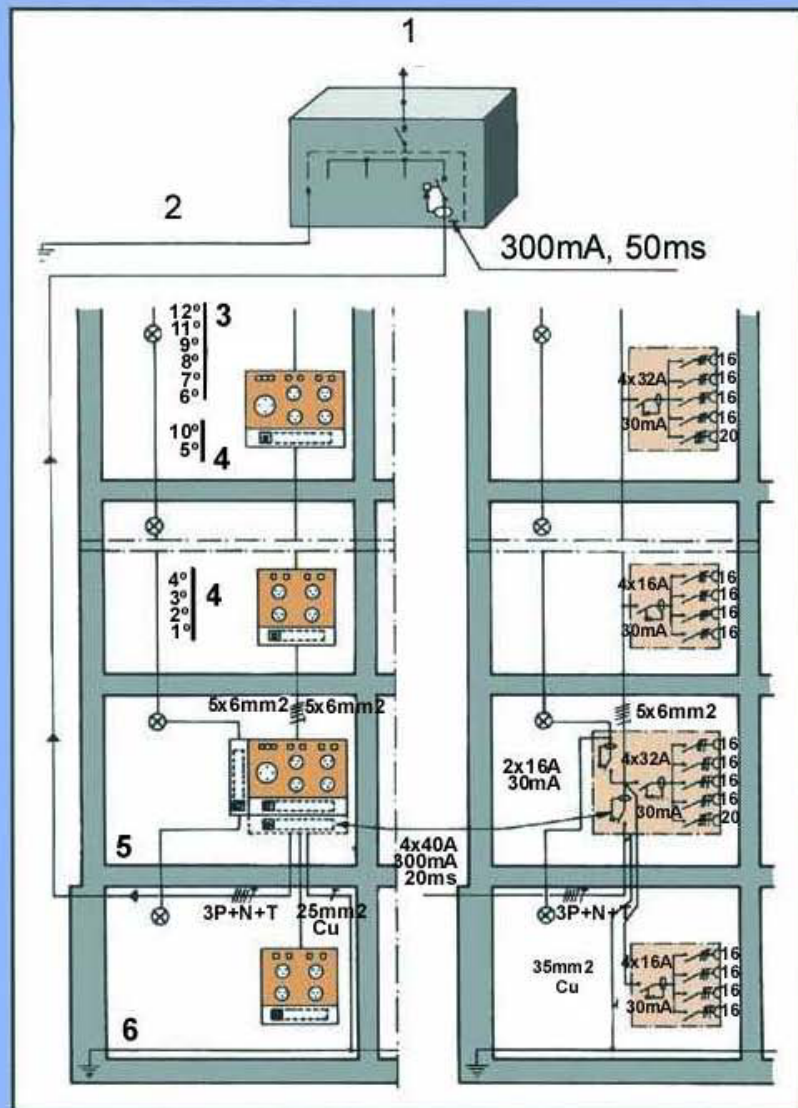

1. Conexión al armario de distribución general.
2. Toma de tierra o conjunto de tomas de tierra interconectadas.
3. Piso.
4. Piso.
5. Planta baja.
6. Anillo protector sótano.

SEÑALES DE OBLIGACION


SIGNIFICADO DE LA SEÑAL	SIMBOLO	COLORES			SEÑAL DE SEGURIDAD
		DEL SIMBOLO	DE SEGURIDAD	DE CONTRASTE	
PROTECCION OBLIGATORIA DE VIAS RESPIRATORIAS		BLANCO	AZUL	BLANCO	
PROTECCION OBLIGATORIA DE LA CABEZA		BLANCO	AZUL	BLANCO	
PROTECCION OBLIGATORIA DEL OIDO		BLANCO	AZUL	BLANCO	
PROTECCION OBLIGATORIA DE LA VISTA		BLANCO	AZUL	BLANCO	
PROTECCION OBLIGATORIA DE LAS MANOS		BLANCO	AZUL	BLANCO	
PROTECCION OBLIGATORIA DE LOS PIES		BLANCO	AZUL	BLANCO	
USO OBLIGATORIO OBLIGATORIO DE PANTALLA		BLANCO	AZUL	BLANCO	
USO OBLIGATORIO OBLIGATORIO DE PROTECTOR AJUSTABLE		BLANCO	AZUL	BLANCO	

Establecimiento de las dimensiones de una se?al hasta una distancia de 50 metros:


$$S \geq \frac{L^2}{2000}$$

Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver la se?al y S la superficie en metros de la se?al


FORMAS QUE PUEDEN SER UTILIZADAS EN ESLINGAS Y ESTROBOS:



NUNCA SE DEBEN CRUZAR LAS ESLINGAS. SI SE MONTA UNA SOBRE OTRA, PUEDE PRODUCIRSE LA ROTURA DE LA ESLINGA QUE QUEDA ATRAPADA.

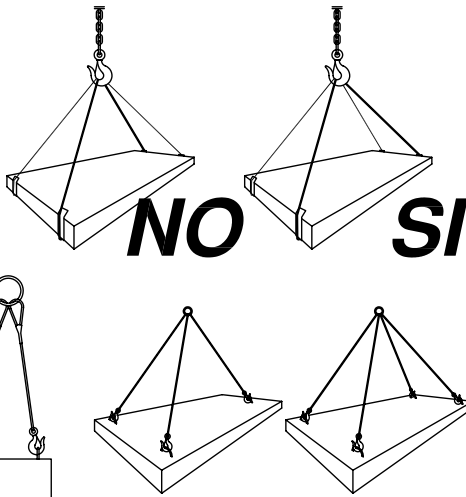

CARGAS HORIZONTALES
(PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA
PARA TENERLAS BIEN SUJETAS)

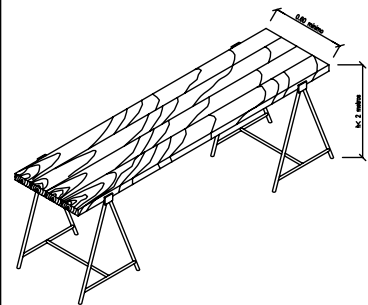

Ancho mínimo de tabloncillos 0.50 metros.

LOS TABLONES DE LA PLATAFORMA DEBEN ATARSE O BIEN SUJETOS A LAS BORRIQUETAS EN ALTURAS SUPERIORES A 2 METROS, SE DISPONDRAN BARRANDILLAS EN TODO EL PERIMETRO. EL CONJUNTO DEBE SER RESISTENTE Y ESTABLE.


NO SOBRECARGAR LOS TABLONES CON EXCESIVA CANTIDAD DE MATERIALES CONCENTRADOS EN UN MISMO PUNTO QUE PODRÍA DESGLOBIAR O INCLUSO LLEGAR A PARTIR LOS TABLONES REPARTIR EL PESO DE MANERA UNIFORME Y SIN CARGAS EXCESIVAS.

NO UTILIZAR PARA EL APOYO DE LOS TABLONES, OTRO ELEMENTO DISTINTO DE LAS BORRIQUETAS.


SI LA DISTANCIA ENTRE BORRIQUETAS ES MAYOR DE 3 METROS, EXISTE EL PELIGRO QUE LOS TABLONES DE LA PLATAFORMA PUEDAN FLECHAR O INCLUSO LLEGAR A ROMPERSE.

NO APOYARSE EN EL CONJUNTO EN NINGUNO DE SUS EXTREMOS.


POSICION CORRECTA DE ESCALERAS DE MANO

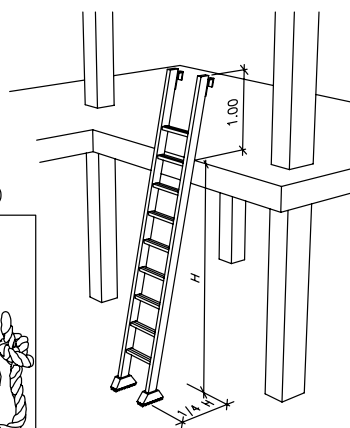

ANCLAJES CINTURON DE SEGURIDAD (Seguro de anclaje móvil)

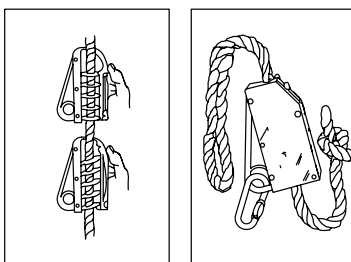

PRECAUCIONES EN EL USO DE ESCALERAS DE MANO

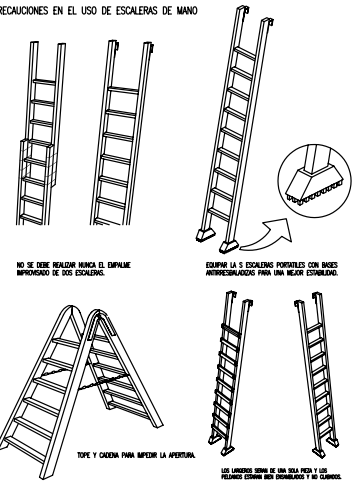

NO SE DEBE RECLINAR NUNCA EL EMPUJE IMPROVISANDO DE DOS ESCALERAS.

EMPUNAR LA S ESCALERAS PORTABLES CON BOCAS IMPROVISANDO PARA UNA MEJOR ESTABILIDAD.

TOPE Y CADENA PARA IMPEDIR LA APERTURA.

LOS LINDEROS DEBEN DE SER SÓLIDOS Y LOS PERNOS DEBEN ESTAR BIEN ENGRANADOS Y NO CERRADOS.

6. pressupost de contracte i per a coneixement de l'administració

AMIDAMENTS

Data: 20/09/23

Pàg.: 1

Obra	00	PRO-063 PAVIMENT PARQUET BARRIS NORD
Capítol	00	TREBALLS PREVIS
Títol 3	00	ENRETIRADA EQUIPAMENT ESPORTIU I PARQUET EXISTENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FR734H22	m2	Enretirada del parquet de fusta malmés existent amb mtjans mecànics i manuals. Inclou enretirada equipament esportiu i tornar-lo a col·locar tan bon punt acabada la intervenció.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SUPERFÍCIE MALMESA		0,000	0,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000	44,800	30,470		1.365,056	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.365,056

2	E2RA8E00	PA	Gestió de residus i deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Inclou contenidors, transport i el canon corresponent.
---	----------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	00	PRO-063 PAVIMENT PARQUET BARRIS NORD
Capítol	02	COL·LOCACIÓ DEL PAVIMENT DE FUSTA FLOTANT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E9QGFG6J	m2	Subministre i col·locació de Paviment àrea elàstic esportiu de fusta, tipus "Mondoelastic Hayaelastic" o equivalent, format per diversos estrats que s'ajunen en obra, confirmant un sistema de 62 mm d'un gruix total: 1- Sistema de paviment esportiu acabat en fusta de primera qualitat amb tacs elàstics com a subbase, el qual haurà de complir les característiques de la normativa EN14904. 2- Làmina de polietilè anti humitat de galga 500, solapada 20 cm entre làmines, damunt de la capa elàstica i per sota de les capes de fusta, per a evitar que arribi humitat a les fustes del sistema. 3- Suports de goma elàstics de disseny troncocònic, d'alçada 30 mm, i diàmetre superior de 65 mm e inferior de 40 mm, fabricats mitjançant el sistema de modelat rotacional, amb cambra d'aire interior. 4- Doble contraxapat fenòlic de 9 mm de gruix, de 2500 mm de llarg i 1250 mm d'ample, creuats 70° entre ells, encolats i cargolats entre si. 5- Superfície final en tarima de fusta de faig de 14 mm d'espessor, amb un mínim de 3,8 mm de fusta noble, 100% natural, vernissada de fàbrica específicament amb un tractament d'ús esportiu que garanteixi les propietats esportives. 6- Sòcol xapejat de fusta simple i elements de remat perimetral. El paviment àrea elàstic compleix els estàndards Europeus EN 14904, incloent la qualificació CE i la EN 13501-1 (reacció al foc: Cfl-S1), certificació FIBA i FIFA FUTSAL" Inclou part proporcional de muntatge, sòcol, així com tots els estris necessaris.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SUPERFÍCIE MALMESA		0,000	0,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000	44,800	30,470		1.365,056	C#*D#*E#*F#
3	Imprevistos		1,000	0,050	1.365,056		68,253	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.433,309

Obra	00	PRO-063 PAVIMENT PARQUET BARRIS NORD
Capítol	03	PINTURA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E898U020	PA	Pintat pista amb pintures de dos components de màxima durabilitat i especialment resistent a un ús intensiu, amb mides normalitzades segons normes NIDE i conforme als reglaments oficials de cada esport. BASQUET + FIBA

AMIDAMENTS

Data: 20/09/23

Pàg.: 2

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
2	E898UXX0	PA	Pintat pista amb pintures de dos components de màxima durabilitat i especialment resistent a un ús intensiu, amb mides normalitzades segons normes NIDE i conforme als reglaments oficials de cada esport. ESCUT+ LLEGENDES, segons plànol adjunt.	

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
--	--	--	-------------------	-------

Obra 00 PRO-063 PAVIMENT PARQUET BARRIS NORD
Capítol 04 XAPES DE REMATS I ESTRIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E9S2LQ3B	ml	Submistre i col·locació de remat de xapa d'acer inoxidable de 1,5 mm de gruix i entre 70 mm d'amplària, col·locat amb fixacions mecàniques sobre paviment de fusta existent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	19,800			19,800	C#*D#*E#*F#
2	Imprevistos		1,000	0,100	19,800		1,980	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT	21,780
2	EMANELX1	UT	Subministrament i col·locació de les tapes i cercles amb el mateix acabat que el paviment, per a tapar els ancoratges existents.	

			AMIDAMENT DIRECTE	8,000
--	--	--	-------------------	-------

3	EAJUDE01	PA	Partida alçada a justificar en petites ajudes de Ram de Paleta; anivellats, transport, etc..	
---	----------	----	--	--

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
--	--	--	-------------------	-------

Obra 00 PRO-063 PAVIMENT PARQUET BARRIS NORD
Capítol 30 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ESOS001	PA	Partida alçada que inclou el treball de Seguretat i Salut inclosos en la documentació corresponent, anexas al projecte executiu.

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
--	--	--	-------------------	-------

PRESSUPOST

Data: 20/09/23

Pàg.: 1

Obra	00	PRO-063 PAVIMENT PARQUET BARRIS NORD
Capítol	00	TREBALLS PREVIS
Títol 3	00	Enretirada Equipament Esportiu i Parquet existent

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR734H22	m2	Enretirada del parquet de fusta malmés existent amb mtjans mecànics i manuals. Inclou enretirada equipament esportiu i tornar-lo a col·locar tan bon punt acabada la intervenció. (P - 9)	17,75	1.365,056	24.229,74
2	E2RA8E00	PA	Gestió de residus i deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Inclou contenidors, transport i el canon corresponent. (P - 1)	5.570,68	1,000	5.570,68
TOTAL	Títol 3		00.00.00			29.800,42

Obra	00	PRO-063 PAVIMENT PARQUET BARRIS NORD
Capítol	02	COL·LOCACIÓ DEL PAVIMENT DE FUSTA FLOTANT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E9QGFG6J	m2			
		Subministre i col·locació de Paviment àrea elàstic esportiu de fusta, tipus "Mondoelastic Hayaelastic" o equivalent, format per diversos estrats que s'ajunten en obra, confirmant un sistema de 62 mm d'un gruix total: 1- Sistema de paviment esportiu acabat en fusta de primera qualitat amb tacs elàstics com a subbase, el qual haurà de complir les característiques de la normativa EN14904. 2- Làmina de polietilè anti humitat de galga 500, solapada 20 cm entre làmines, damunt de la capa elàstica i per sota de les capes de fusta, per a evitar que arribi humitat a les fustes del sistema. 3- Suports de goma elàstics de disseny troncocònic, d'alçada 30 mm, i diàmetre superior de 65 mm e inferior de 40 mm, fabricats mitjançant el sistema de modelat rotacional, amb cambra d'aire interior. 4- Doble contraxapat fenòlic de 9 mm de gruix, de 2500 mm de llarg i 1250 mm d'ample, creuats 70° entre ells, encolats i cargolats entre si. 5- Superfície final en tarima de fusta de faig de 14 mm d'espessor, amb un mínim de 3,8 mm de fusta noble, 100% natural, vernissada de fàbrica específicament amb un tractament d'ús esportiu que garanteixi les propietats esportives. 6- Sòcol xapejat de fusta simple i elements de remat perimetral. El paviment àrea elàstic compleix els estàndards Europeus EN 14904, incloent la qualificació CE i la EN 13501-1 (reacció al foc: Cfl-S1), certificació FIBA i FIFA FUTSAL'' Inclou part proporcional de muntatge, sòcol, així com tots els estris necessaris. (P - 4)	78,55	1.433,309	112.586,42
TOTAL	Capítol	00.02			112.586,42

Obra	00	PRO-063 PAVIMENT PARQUET BARRIS NORD
Capítol	03	PINTURA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E898U020	PA	Pintat pista amb pintures de dos components de màxima durabilitat i especialment resistents a un ús intensiu, amb mides normalitzades segons normes NIDE i conforme als reglaments oficials de cada esport. BASQUET + FIBA	4.191,18	1,000	4.191,18

PRESSUPOST

Data: 20/09/23

Pàg.: 2

		(P - 2)			
2	E898UXX0	PA	Pintat pista amb pintures de dos components de màxima durabilitat i especialment resistent a un ús intensiu, amb mides normalitzades segons normes NIDE i conforme als reglaments oficials de cada esport. ESCUT+ LLEGENDES, segons plànol adjunt.	4.614,20	1,000
		(P - 3)			4.614,20

TOTAL	Capítol	00.03	8.805,38
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	00	PRO-063 PAVIMENT PARQUET BARRIS NORD
------	----	--------------------------------------

Capítol	04	XAPES DE REMATS I ESTRIS
---------	----	--------------------------

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E9S2LQ3B	ml	Subministre i col·locació de remat de xapa d'acer inoxidable de 1,5 mm de gruix i entre 70 mm d'amplària, col·locat amb fixacions mecàniques sobre paviment de fusta existent. (P - 5)	14,43	21,780
2	EMANELX1	UT	Subministrament i col·locació de les tapes i cercles amb el mateix acabat que el paviment, per a tapar els ancoratges existents. (P - 7)	48,74	8,000
3	EAJUDE01	PA	Partida alçada a justificar en petites ajudes de Ram de Paleta; anivellats, transport, etc.. (P - 6)	2.409,11	1,000

TOTAL	Capítol	00.04	3.113,32
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	00	PRO-063 PAVIMENT PARQUET BARRIS NORD
------	----	--------------------------------------

Capítol	30	SEGURETAT I SALUT
---------	----	-------------------

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ESOS001	PA	Partida alçada que inclou el treballs de Seguretat i Salut inclosos en la documentació corresponent, anexada al projecte executiu. (P - 8)	367,00	1,000

TOTAL	Capítol	00.30	367,00
--------------	----------------	--------------	---------------

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 20/09/23

Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	00.00	TREBALLS PREVIS	29.800,42
Capítol	00.02	COL·LOCACIÓ DEL PAVIMENT DE FUSTA FLOTANT	112.586,42
Capítol	00.03	PINTURA	8.805,38
Capítol	00.04	XAPES DE REMATS I ESTRIS	3.113,32
Capítol	00.30	SEGURETAT I SALUT	367,00
Obra	00	PRO-063 PAVIMENT PARQUET BARRIS NORD	154.672,54
			154.672,54
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	00	PRO-063 PAVIMENT PARQUET BARRIS NORD	154.672,54
			154.672,54

PROJECTE EXECUTIU PEL CANVI DEL PARQUET DE FUSTA DEL PAVELLÓ BARRIS NORD, LLEIDA
Ajuntament de Lleida
ARQUITECTE: Manel Gonzàlez Solanes

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	154.672,54
Subtotal	154.672,54
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 154.672,54.....	9.280,35
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 154.672,54.....	20.107,43
21 % IVA SOBRE 184.060,32.....	38.652,67
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	222.712,99

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(DOS-CENTS VINT-I-DOS MIL SET-CENTS DOTZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/09/23

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	E2RA8E00	PA	Gestió de residus i deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Inclou contenidors, transport i el canon corresponent. (CINC MIL CINQ-CENTS SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	5.570,68 €
P-2	E898U020	PA	Pintat pista amb pintures de dos components de màxima durabilitat i especialment resistent a un ús intensiu, amb mides normalitzades segons normes NIDE i conforme als reglaments oficials de cada esport. BASQUET + FIBA (QUATRE MIL CENT NORANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	4.191,18 €
P-3	E898UXX0	PA	Pintat pista amb pintures de dos components de màxima durabilitat i especialment resistent a un ús intensiu, amb mides normalitzades segons normes NIDE i conforme als reglaments oficials de cada esport. ESCUT+ LLEGENDES, segons plànol adjunt. (QUATRE MIL SIS-CENTS CATORZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	4.614,20 €
P-4	E9QGFG6J	m2	Subministre i col·locació de Paviment àrea elàstic esportiu de fusta, tipus "Mondoelastic Hayaelastic" o equivalent, format per diversos estrats que s'ajunten en obra, confirmant un sistema de 62 mm d'un gruix total: 1- Sistema de paviment esportiu acabat en fusta de primera qualitat amb tacs elàstics com a subbase, el qual haurà de complir les característiques de la normativa EN14904. 2- Làmina de polietilè anti humitat de galga 500, solapada 20 cm entre làmines, damunt de la capa elàstica i per sota de les capes de fusta, per a evitar que arribi humitat a les fustes del sistema. 3- Suports de goma elàstics de disseny troncocònic, d'alçada 30 mm, i diàmetre superior de 65 mm e inferior de 40 mm, fabricats mitjançant el sistema de modelat rotacional, amb cambra d'aire interior. 4- Doble contraxapat fenòlic de 9 mm de gruix, de 2500 mm de llarg i 1250 mm d'ample, creuats 70° entre ells, encolats i cargolats entre si. 5- Superfície final en tarima de fusta de faig de 14 mm d'espessor, amb un mínim de 3,8 mm de fusta noble, 100% natural, vernissada de fàbrica específicament amb un tractament d'ús esportiu que garanteixi les propietats esportives. 6- Sòcol xapejat de fusta simple i elements de remat perimetral. El paviment àrea elàstic compleix els estàndards Europeus EN 14904, incloent la qualificació CE i la EN 13501-1 (reacció al foc: Cfl-S1), certificació FIBA i FIFA FUTSAL" Inclou part proporcional de muntatge, sòcol, així com tots els estris necessaris. (SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	78,55 €
P-5	E9S2LQ3B	ml	Subministre i col·locació de remat de xapa d'acer inoxidable de 1,5 mm de gruix i entre 70 mm d'amplària, col·locat amb fixacions mecàniques sobre paviment de fusta existent. (CATORZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	14,43 €
P-6	EAJUDE01	PA	Partida alçada a justificar en petites ajudes de Ram de Paleta; anivellats, transport, etc.. (DOS MIL QUATRE-CENTS NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	2.409,11 €
P-7	EMANELX1	UT	Subministrament i col·locació de les tapes i cercles amb el mateix acabat que el paviment, per a tancar els ancoratges existents. (QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	48,74 €
P-8	ESOS001	PA	Partida alçada que inclou el treball de Seguretat i Salut inclosos en la documentació corresponent, annexada al projecte executiu. (TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS)	367,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/09/23 Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-9	FR734H22	m2	Enretirada del parquet de fusta malmés existent amb mtjans mecànics i manuals. Inclou enretirada equipament esportiu i tornar-lo a col·locar tan bon punt acabada la intervenció. (DISSET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	17,75 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 20/09/23

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	E2RA8E00	PA	Gestió de residus i deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Inclou contenidors, transport i el canon corresponent.	5.570,68	€
	B2RA8E00	PA	Gestió de residus i deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Inclou contenidors, transport i el canon corresponent.	5.570,68000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-2	E898U020	PA	Pintat pista amb pintures de dos components de màxima durabilitat i especialment resistent a un ús intensiu, amb mides normalitzades segons normes NIDE i conforme als reglaments oficials de cada esport. BASQUET + FIBA	4.191,18	€
	B89ZU020	PA	Pintura especial per a paviments esportius	4.191,18000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-3	E898UXX0	PA	Pintat pista amb pintures de dos components de màxima durabilitat i especialment resistent a un ús intensiu, amb mides normalitzades segons normes NIDE i conforme als reglaments oficials de cada esport. ESCU+ LLEGENDES, segons plànol adjunt.	4.614,20	€
			Altres conceptes	4.614,20000	€
P-4	E9QGFG6J	m2	Subministre i col·locació de Paviment àrea elàstic esportiu de fusta, tipus "Mondoelastic Hayaelastic" o equivalent, format per diversos estrats que s'ajunten en obra, confirmant un sistema de 62 mm d'un gruix total: 1- Sistema de paviment esportiu acabat en fusta de primera qualitat amb tacs elàstics com a subbase, el qual haurà de complir les característiques de la normativa EN14904. 2- Làmina de polietilè anti humitat de galga 500, solapada 20 cm entre làmines, damunt de la capa elàstica i per sota de les capes de fusta, per a evitar que arribi humitat a les fustes del sistema. 3- Suports de goma elàstics de disseny troncocònic, d'alçada 30 mm, i diàmetre superior de 65 mm e inferior de 40 mm, fabricats mitjançant el sistema de modelat rotacional, amb cambra d'aire interior. 4- Doble contraxapat fenòlic de 9 mm de gruix, de 2500 mm de llarg i 1250 mm d'ample, creuats 70° entre ells, encolats i cargolats entre si. 5- Superfície final en tarima de fusta de faig de 14 mm d'espessor, amb un mínim de 3,8 mm de fusta noble, 100% natural, vernissada de fàbrica específicament amb un tractament d'ús esportiu que garanteixi les propietats esportives. 6- Sòcol xapejat de fusta simple i elements de remat perimetral. El paviment àrea elàstic compleix els estàndards Europeus EN 14904, incloent la qualificació CE i la EN 13501-1 (reacció al foc: Cfl-S1), certificació FIBA i FIFA FUTSAL" Inclou part proporcional de muntatge, sòcol, així com tots els estris necessaris.	78,55	€
	B9QGFG6J	m2	Subministre de Paviment àrea elàstic esportiu de fusta, tipus Mondoelastic Hayaelastic, format per diversos estrats que s'ajunten en obra, confirmant un sistema de 62 mm d'espessor total: 1- Sistema de paviment esportiu acabat en fusta de primera qualitat amb tacs elàstics com a subbase, el qual haurà de complir les característiques de la normativa EN14904. 2- Làmina de polietilè anti humitat de galga 500, solapada 20 cm entre làmines, damunt de la capa elàstica i per sota de les capes de fusta, per a evitar que arribi humitat a les fustes del sistema. 3- Suports de goma elàstics de disseny troncocònic, d'alçada 30 mm, i diàmetre superior de 65 mm e inferior de 40 mm, fabricats mitjançant el sistema de modelat rotacional, amb cambra d'aire interior. 4- Doble contraxapat fenòlic de 9 mm de gruix, de 2500 mm de llarg i 1250 mm d'ample, creuats 70° entre ells, encolats i cargolats entre si. 5- Superfície final en tarima de fusta de faig de 14 mm d'espessor, amb un mínim de 3,8 mm de fusta noble, 100% natural, vernissada de fàbrica específicament amb un tractament d'ús esportiu que garanteixi les propietats esportives. 6- Sòcol xapejat de fusta simple i elements de remat perimetral.El paviment àrea elàstic	40,15970	€


QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 20/09/23

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			compleix els estàndards Europeus EN 14904, incloent la qualificació CE i la EN 13501-1 (reacció al foc: Cfl-S1), certificació FIBA i FIFA FUTSAL'' . Inclou sòcol segons documentació gràfica	
			Altres conceptes	38,39030 €
P-5	E9S2LQ3B	ml	Submistre i col·locació de remat de xapa d'acer inoxidable de 1,5 mm de gruix i entre 70 mm d'amplària, col·locat amb fixacions mecàniques sobre paviment de fusta existent.	14,43 €
	B0CHLQ0B	ml	Remat de planxa d'acer inoxidable de 1,5 mm de gruix	10,52660 €
	B0A62E90	u	Tac d'acer de d 8 mm, amb cargol, volandera i femella	1,44000 €
			Altres conceptes	2,46340 €
P-6	EAJUDE01	PA	Partida alçada a justificar en petites ajudes de Ram de Paleta; anivellats, transport, etc..	2.409,11 €
			Sense descomposició	2.409,11000 €
P-7	EMANELX1	UT	Subministrament i col·locació de les tapes i cercles amb el mateix acabat que el paviment, per a tapar els ancoratges existents.	48,74 €
			Altres conceptes	48,74000 €
P-8	ESOS001	PA	Partida alçada que inclou el treballs de Seguretat i Salut inclosos en la documentació corresponent, anexada al projecte executiu.	367,00 €
			Sense descomposició	367,00000 €
P-9	FR734H22	m2	Enretirada del parquet de fusta malmés existent amb mtjans mecànics i manuals. Inclou enretirada equipament esportiu i tornar-lo a col·locar tan bon punt acabada la intervenció.	17,75 €
			Altres conceptes	17,75000 €

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

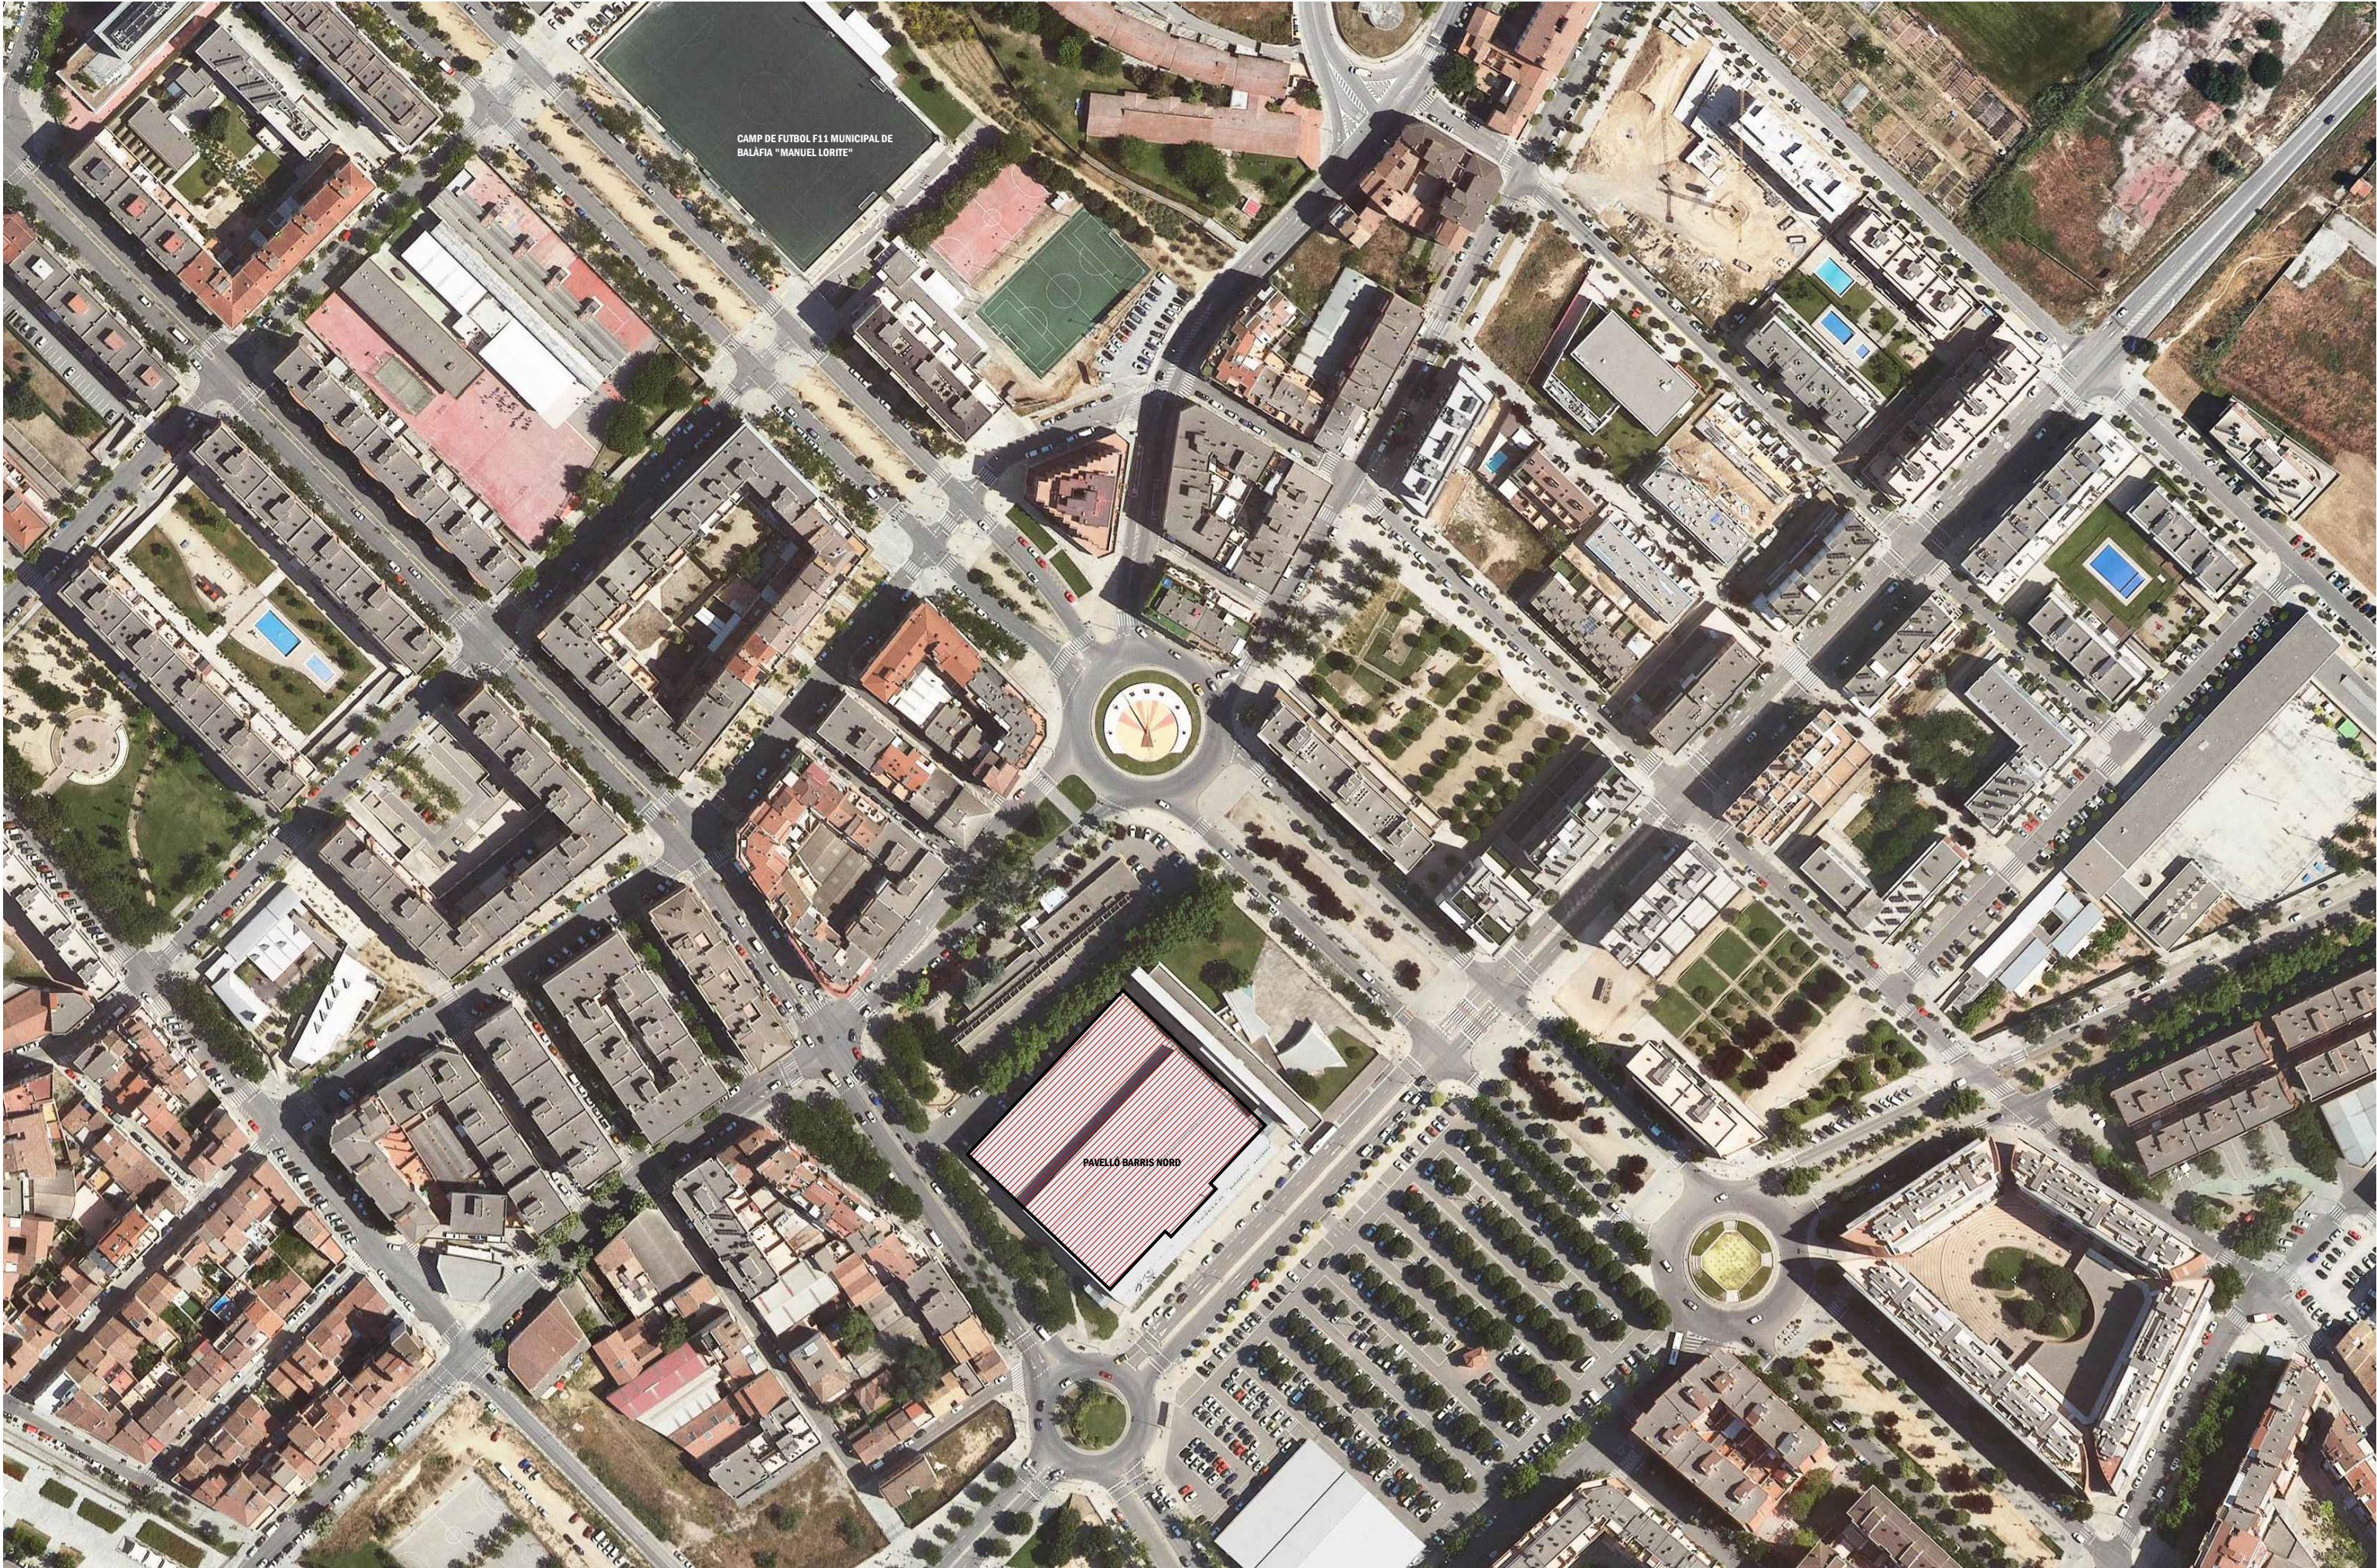

ARQUITECTES
MANEL GONZALEZ SOLANES
n m colegiat 32684
ALEIX GONZ LEZ CALL
n m colegiat 81671

COL·LABORADORS
ENGINEYER D'INSTAL·LACIONS

ENGINEYER D'ESTRUCTURES

CLIENT
PAERIA DE LLEIDA
REPRESENTANT

PROJECTE PRO-063
PARQUET PAVELL  BARRIS NORD
UBICACI 
Av. Prat de la Riba, 113
25005 Lleida

NOTA GENERALS
No prendre mesures sobre pl nol. Totes les mesures s'han de comprovar a l'obra
Les possibles contradiccions entre els documents del projecte han de ser comunicades immediatament a la D.F. i determinar  la validesa i prioritat.
Els pl nols han de ser llegits en conjunt amb tots els documents rellevants del projecte, inclosos la documentaci  escrita, instal·lacions i fa ana.

FASE
Projecte
Executi 


PL NOL E: 1.2000
DG.U. Definici  urbanis tica i implantaci 
U.01. Situaci 
Ubicaci 

VERSI : 4
CODI PL NOL:


DATA: 20/09/2023

GL01



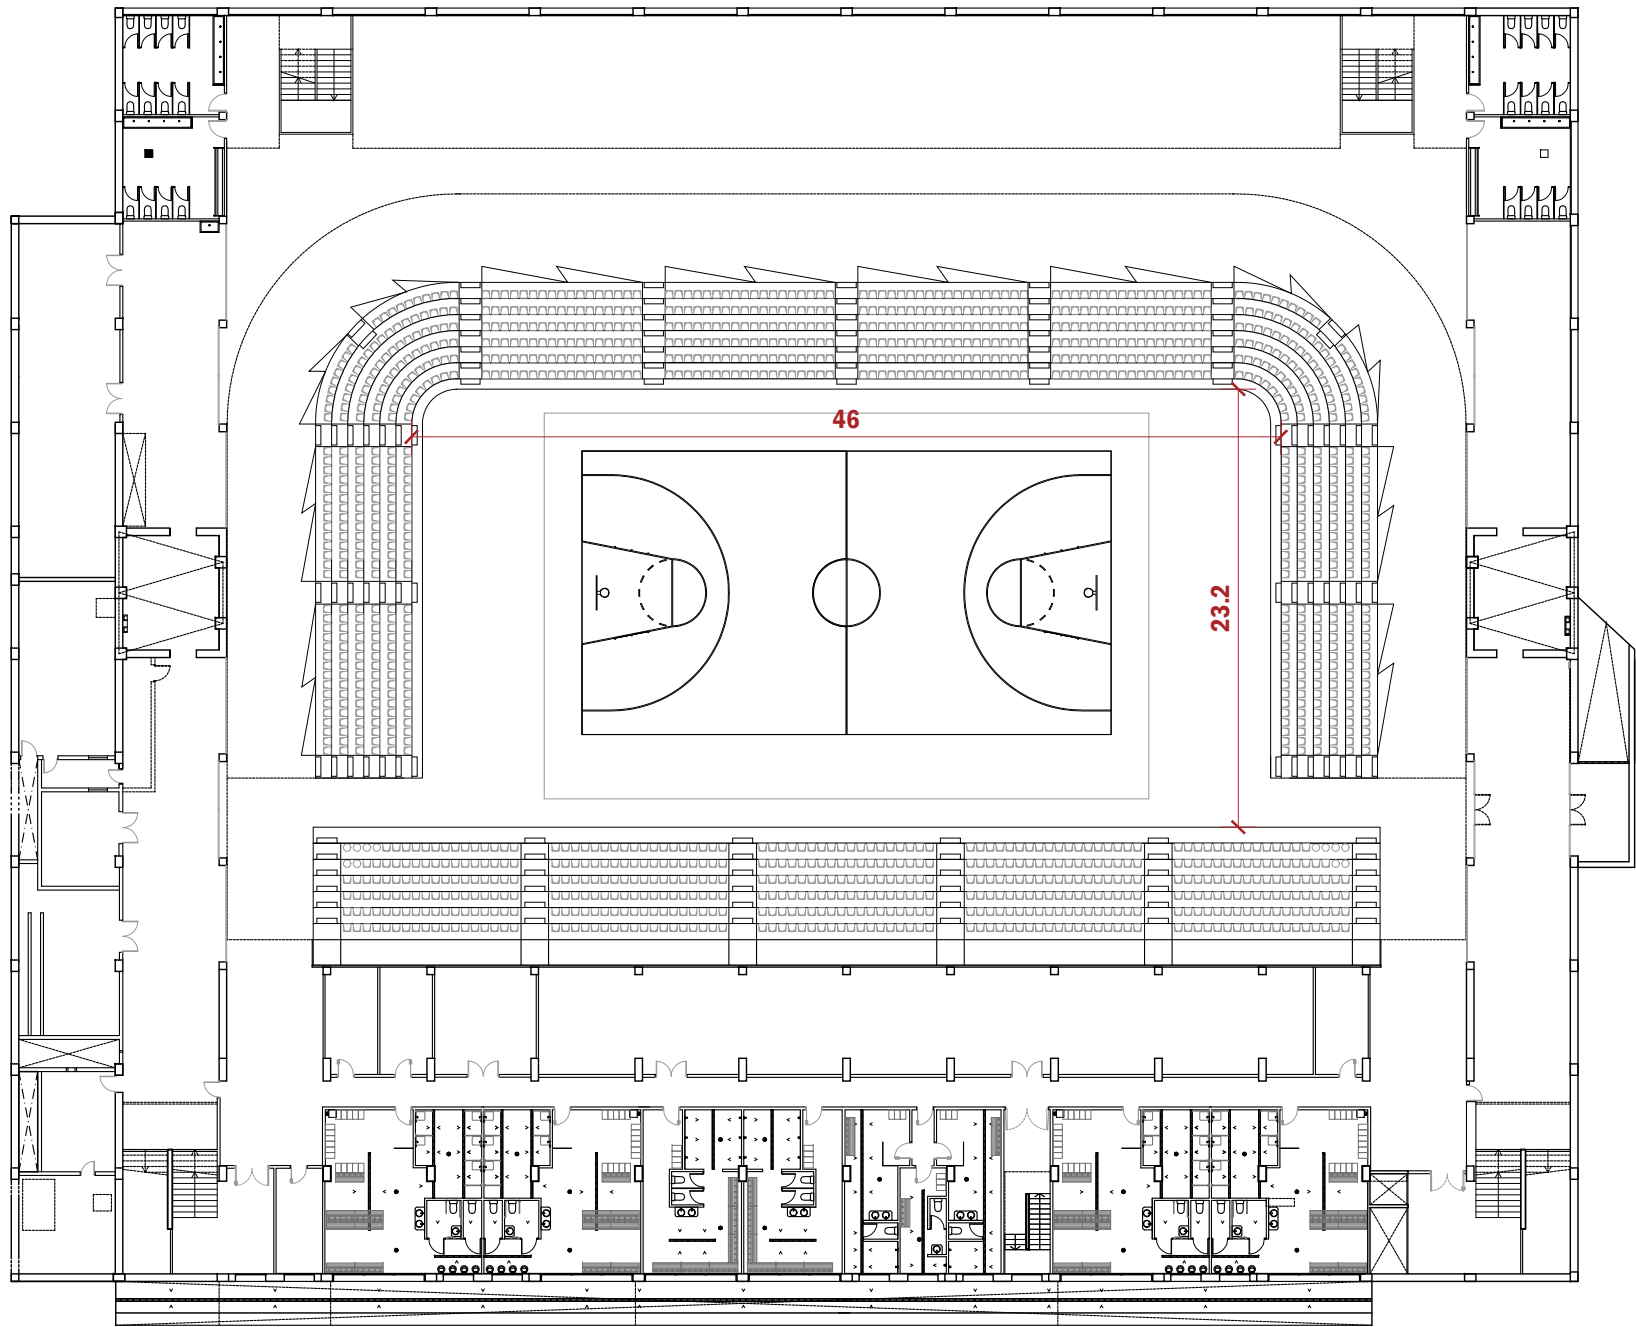

PLANTA 1.400

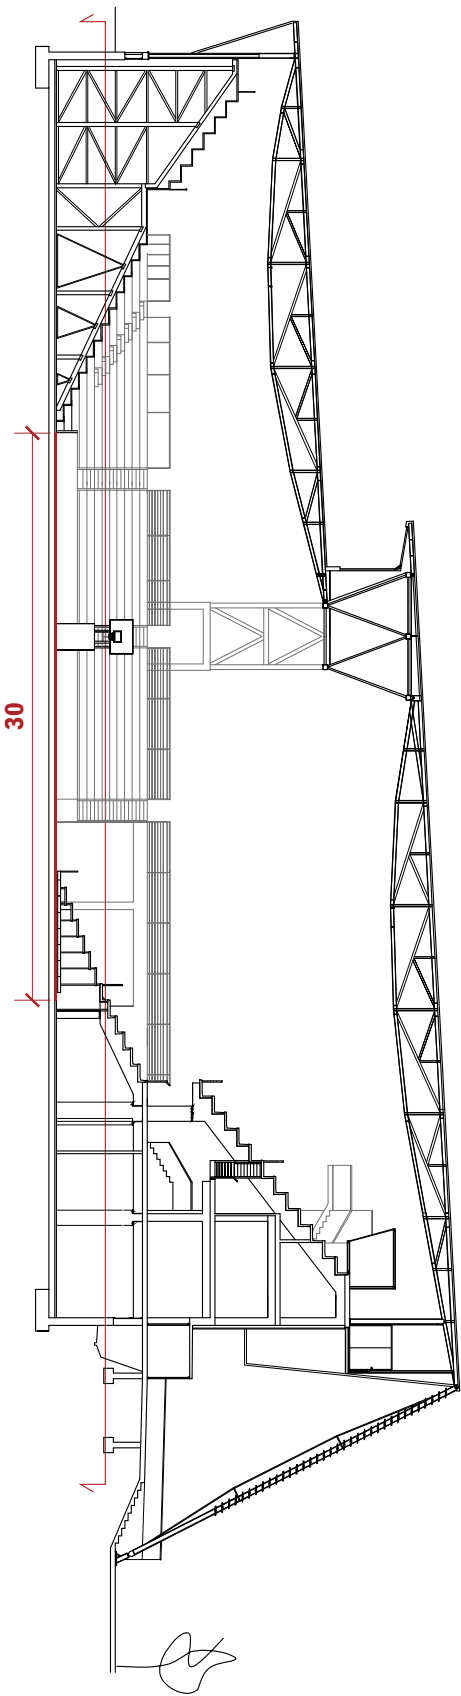

SECCIÓ

ARQUITECTES
MANEL GONZALEZ SOLANES
núm. col·legiat 32684
ALEIX GONZÀLEZ CALL
núm. col·legiat 81671

COL·LABORADORS
ENGINEYER D'INSTAL·LACIONS

ENGINEYER D'ESTRUCTURES

CLIENT
PAERIA DE LLEIDA
REPRESENTANT

PROJECTE PRO-063
PARQUET PAVELLÓ BARRIS NORD
UBICACIÓ
Av. Prat de la Riba, 113
25005 Lleida

NOTA GENERAL
No prendre mesures sobre plànol. Totes les mesures s'han de comprovar a l'obra.
Les possibles contradiccions entre els documents del projecte han de ser comunicades immediatament a la D.F. i determinarà la validesa i prioritat.
Els plànols han de ser llegits en conjunt amb tots els documents rellevants del projecte, inclosos la documentació escrita, instal·lacions i façana.


FASE
Projecte Executiu

PLÀNOL E: 1.400
DG.U. Definició urbanística i implantació
U.01. Situació
Superfícies i secció

VERSÍO: 4
CODI PLÀNOL:

DATA: 20/09/2023


GL03

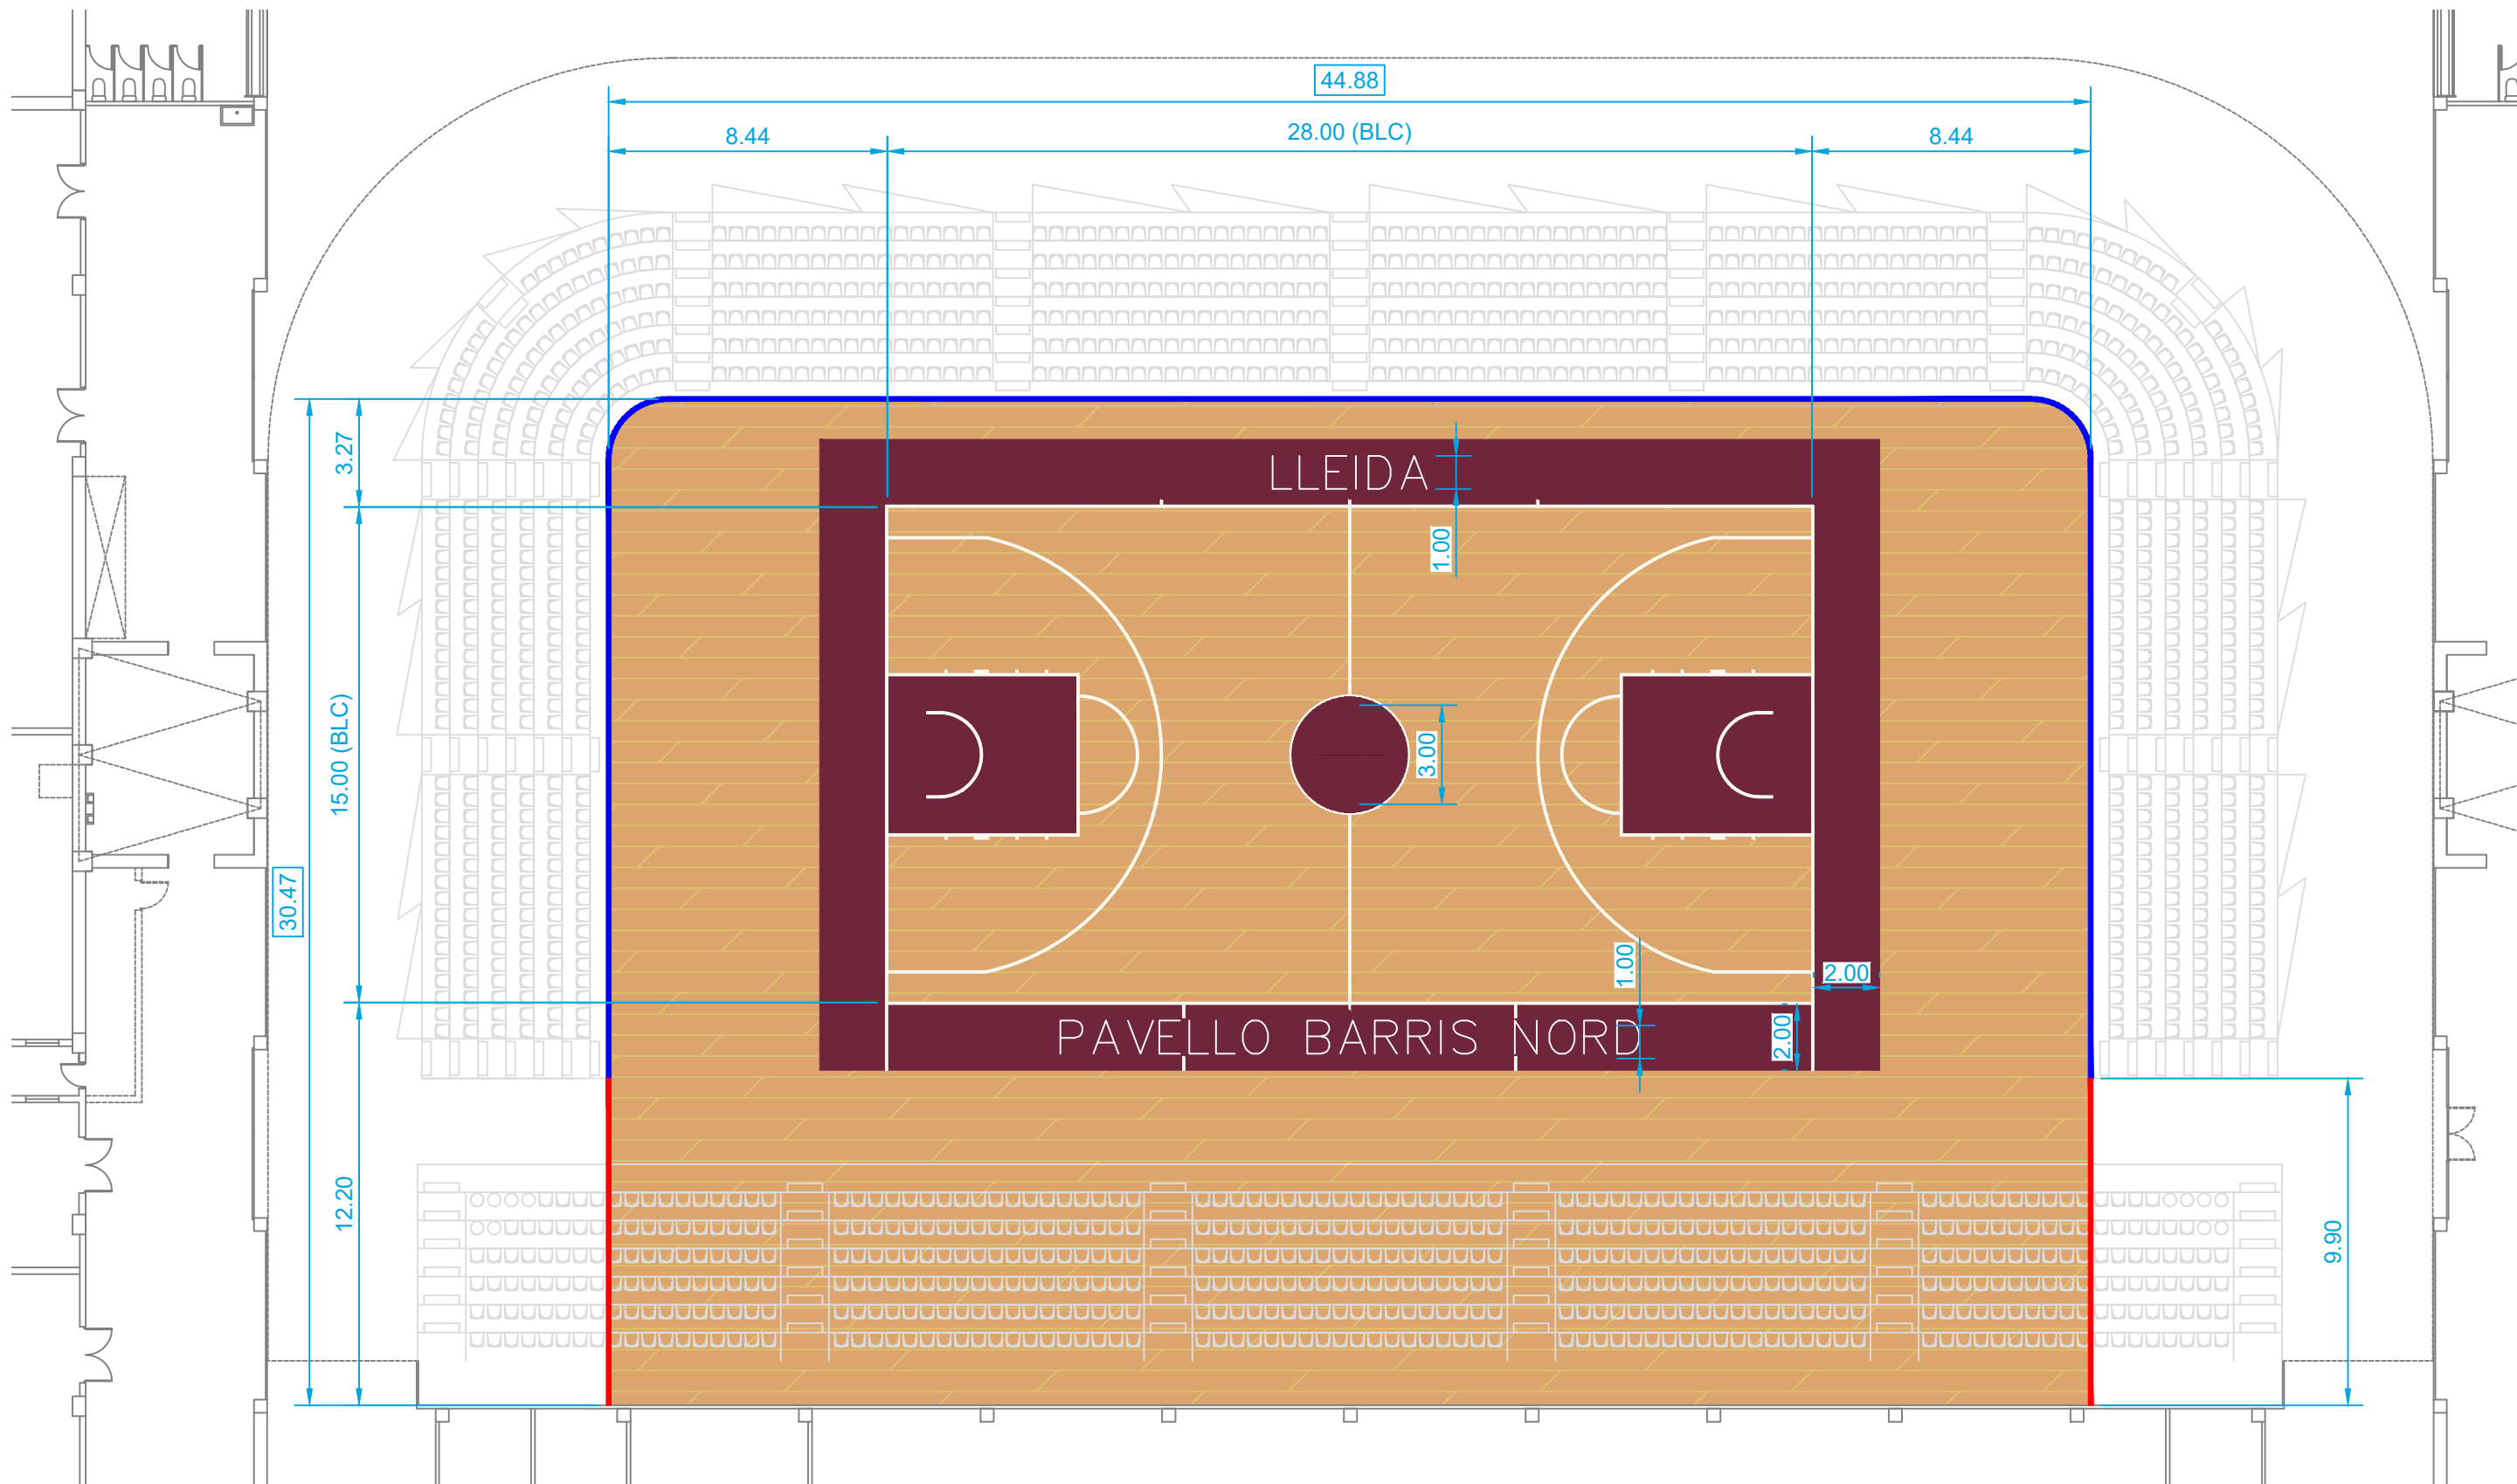

SUPERFICIE ACTUACIÓN (PAV. MADERA):

REMATE JUNTA:

MARCAJE DE CAMPOS Y PRIORIDAD:



· HAYAELASTIC **1366.30 m²** (44.88x30.47 m²)

· RODAPIÉ PERIMETRAL **84.50 ml**

· CHAPA PLANA **19.80 ml**

1.- Baloncesto (28x15m): central, color blanco.

- Pintado perímetro, círculo central y zonas (color ref. PANTONE 209 C)
- Escudo círculo central (color blanco)
- Rótulos LLEIDA y PAVELLO BARRIS NORD (tipografía UNIVERS)

ARQUITECTES
MANEL GONZALEZ SOLANES
núm colegiat 32684
ALEIX GONZÁLEZ CALL
núm colegiat 81671

COL·LABORADORS
ENGINEYER D'INSTAL·LACIONS
ENGINEYER D'ESTRUCTURES

CLIENT
PAERIA DE LLEIDA
REPRESENTANT

PROJECTE PRO-063
PARQUET PAVELLÓ BARRIS NORD
UBICACIÓ
Av. Prat de la Riba, 113
25005 Lleida



NOTA GENERALS
No prendre mesures sobre plànol. Totes les mesures s'han de comprovar a l'obra
Les possibles contradiccions entre els documents del projecte han de ser comunicades immediatament a la D.F. i determinarà la validesa i prioritat.
Els plànols han de ser llegits en conjunt amb tots els documents rellevants del projecte, inclosos la documentació escrita, instal·lacions i façana.

FASE
Projecte
Executiu

PLÀNOL E: 1:200
DG.U. Definició urbanística i implantació
U.01. Situació
Planta Pavelló. Paviments



VERSÍO: 4
CODI PLÀNOL:
DATA: 20/09/2023

GL04

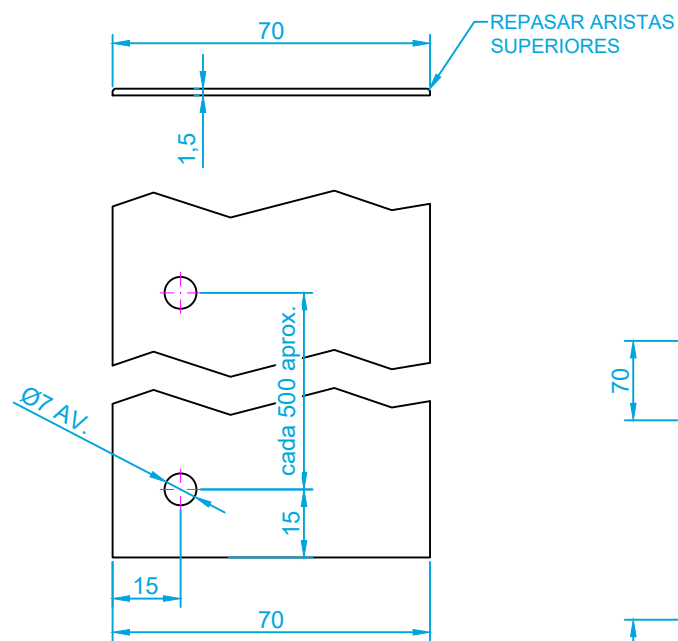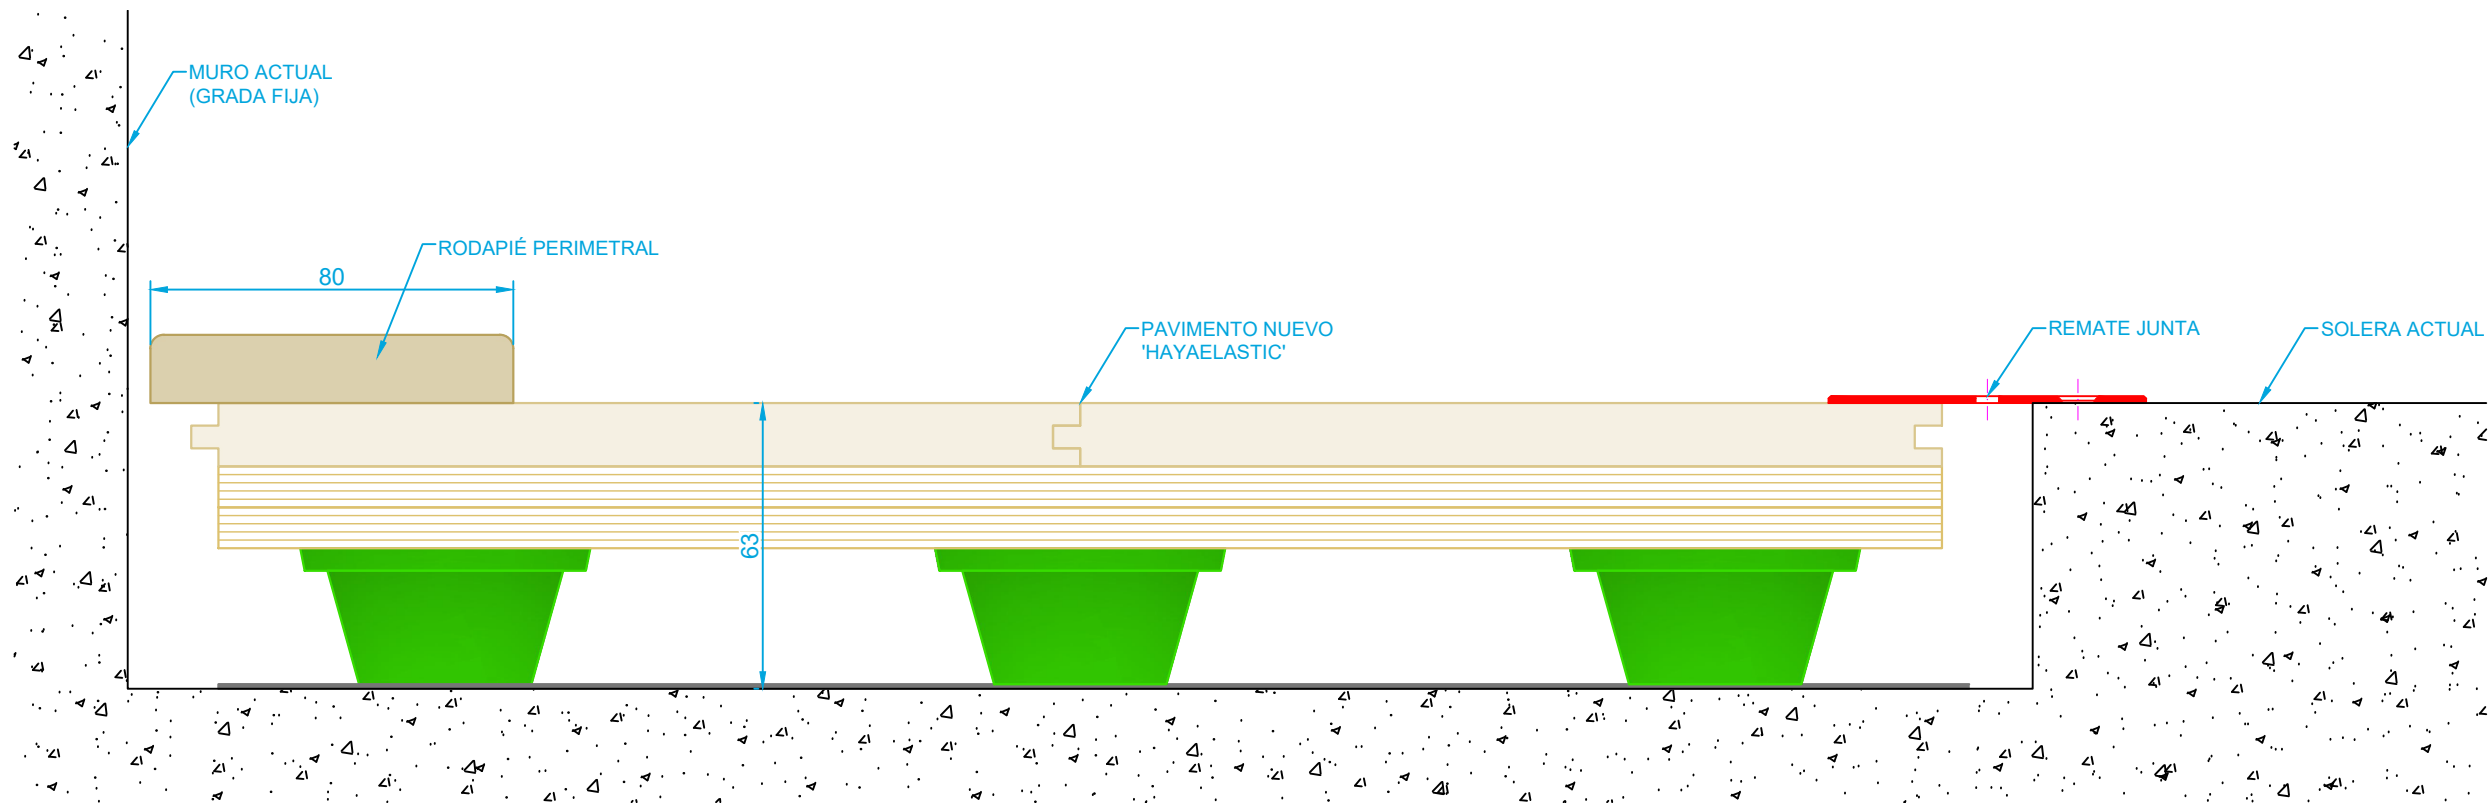

CHAPA LISA (PUNZONADA)
ACERO S235JR
ESPESOR 1,5 mm

PUNZONADO: Realizar un agujero de Ø5 cada 50 mm

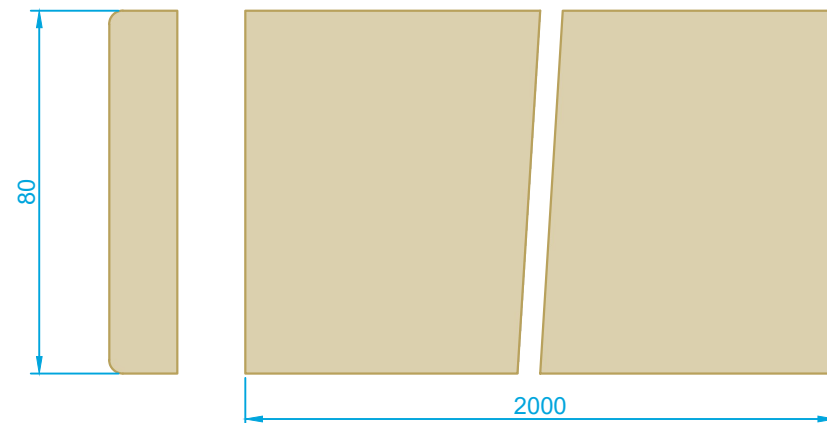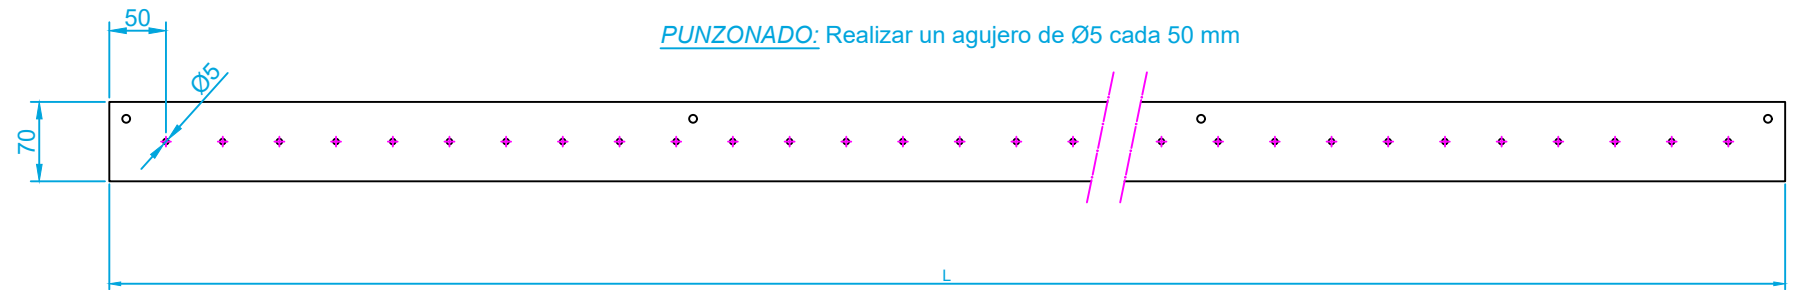

RODAPIÉ PERIMETRAL
MADERA

ARQUITECTES
MANEL GONZALEZ SOLANES
núm. col·legiat 32684
ALEIX GONZÀLEZ CALL
núm. col·legiat 81671

COL·LABORADORS
ENGINEYER D'INSTAL·LACIONS
ENGINEYER D'ESTRUCTURES

CLIENT
PAERIA DE LLEIDA
REPRESENTANT

PROJECTE PRO-063
PARQUET PAVELLÓ BARRIS NORD
UBICACIÓ
Av. Prat de la Riba, 113
25005 Lleida

NOTA GENERALS
No prendre mesures sobre plànol. Totes les mesures s'han de comprovar a l'obra.
Les possibles contradiccions entre els documents del projecte han de ser comunicades immediatament a la D.F. i determinarà la validesa i prioritat.
Els plànols han de ser llegits en conjunt amb tots els documents rellevants del projecte, inclosos la documentació escrita, instal·lacions i façana.

FASE
Projecte Executiu

PLÀNOL E: 1.200
DG.U. Definició urbanística i implantació
U.01. Situació
Planta Pavelló. Paviments

VERSÍO: 4
CODI PLÀNOL:

DATA: 20/09/2023

GL05
